

گزارش پیشرفت پروژه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

گزارش یازدهم

پروژه:

توان افزایشی جامعه محلی با رویکرد ایجاد ۲۱ صندوق مالی خرد،
هدایت ، حمایت و پشتیبانی برای ایجاد و توسعه و پایداری کسب و کارهای
خرد با الگوی LNSIE در شهرستان خمین

کار مشترک موسسه خیریه نعیم، شرکت کارآفرینی زاگرس و صندوق کارآفرینی امید



شرکت کارآفرینی زاگرس

فهرست مطالب

۳	مقدمه.....
۴	موسسه خیریه نعیم و اهداف
۷	گزارش توصیفی اجرای پروژه.....
۱۳	جدول همکاران پروژه و تسهیلگران
۱۴	جلسات مهم برگزار شده در راستای پروژه.....
۱۶	فعالیت های کلی پروژه
۱۹	جدول تشکیل صندوق ها.....
	کسب و کارهای ایجاد شده
۲۰	مشکلات و ریسک های دوره گزارش دهی و جدول پیشرفت کار.....
۲۱	اطلاعات اکولوژیکی روستاها و محلات پیش بینی شده برای ایجاد صندوق.....
۳۸	جدول تاخیرات کلیدی پروژه.....
۳۸	تغییرات کلی پروژه
۳۹	تصاویر اجرای پروژه

مقدمه:

افزایش قابلیت‌های بشر و بسط انتخاب‌های مردم، هدف توسعه است. توانمندی علاوه بر ارزش ذاتی، ارزش ابزاری نیز دارد. پیوند بین توانمندسازی و پیامدهای توسعه‌ی به ویژه فقرزدایی وجود دارد که انگیزه‌های قوی برای توسعه و پیشبرد توانمندسازی در مداخله‌ها را فراهم می‌کند. در واقع، رشد توانمندی افراد، محرک توسعه است.

در سال‌های اخیر، طرح‌های متعددی در ایران برای توانمندسازی و فقرزدایی اجرا شده است. یکی از طرح‌ها، طرح صندوق‌های مالی خرد محلی است

برنامه تامین مالی خرد، یکی از تدابیر مطرح برای رشد توانمندی افراد مطرح شده است. صندوق‌های خرد محلی، راهبردی توسعه‌ای است که در سراسر جهان برای تحقق توسعه اجتماعی اقتصادی گسترش یافته است. پارادایم زیربنا و محرک برنامه‌های صندوق‌های خرد مالی، "پارادایم خودپایداری مالی" است. که در آن ادعا می‌شود خانوارهای فقیر سراسر جهان قادر خواهند شد با دریافت اعتبار از فقر‌رهایی‌یابند نه با کمک‌های توسعه‌ای...

در حال حاضر، موفقیت برنامه‌های مالی خرد به عنوان عاملی موثر در فقرزدایی شناخته شده است. حامیان این رویکرد از نرخ‌های بازپرداخت بیشتر از ۹۵ درصد، مشارکت فراوان زنان، تحقق بهبود و پیشرفت‌هایی در سلامت و آموزش کودکان و ظرفیت برنامه‌های مذکور برای دستیابی به پایداری مالی در بلندمدت یاد می‌کنند. این رویکرد جدید، ظرفیت موجود در نهادها و قراردادهای نوآورانه‌ی را نشان می‌دهد که میتواند شرایط زندگی جوامع کم‌درآمد را بهبود بخشد.

پایداری، انتخاب خودجوش اعضا (توسط خودشان)، وام‌دهی گروهی، تعهد مشترک و نظارت همتایان، زمان بندی مناسب برای بازپرداخت وام (عمدتاً با تعدد بالا و فواصل کم میان اقساط)، وام‌دهی صعودی (افزایش تدریجی میزان وام) استفاده از جایگزین‌های وثیقه مانند پس‌انداز و گاهی همراهی برنامه‌های خرد مالی با خدمات اجتماعی اولیه (آموزش، سلامت و بهداشت) و پیگیری اهداف توسعه اجتماعی از ویژگی‌های برنامه‌های اعتبار خرد و تامین مالی خرد است.

موسسه خیریه نعیم:

مؤسسه ای است غیر سیاسی، غیر تجاری و غیر انتفاعی که با استعانت از خداوند متعال و با هدف کلی حمایت از خانواده های نیازمند و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بنیان نهاده شده است. منابع اولیه این موسسه از محل وصیت مرحوم حاج محمد مومنی (از بنیانگذاران فرهنگ خمین) تامین شده است. این موسسه تا قبل از ثبت رسمی و از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را با کمک به افراد محروم شروع کرده و پس از دریافت مجوز از نیروی انتظامی و ثبت رسمی در موسسه ثبت شرکتها از سال ۱۳۹۷ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است

□ موسسه خیریه نعیم در صدد آن است که با تقویت توانایی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مخاطبین خود، زمینه را برای ارتقاء و بهبود کیفیت و رفاه زندگی آنان فراهم سازد. این موسسه، فعالیت خود را در حوزه " حمایت و توانمندسازی " و " اشتغال و کارآفرینی " متمرکز کرده است.

□ موسسه نعیم محدوده فعالیت خود را کل کشور برگزیده است، لیکن برای شروع فعالیتهای رسمی خود شهرستان خمین (شهر خمین و روستاهای تابعه) را به عنوان پایلوت و اولویت اول خود انتخاب نموده است.

□ اولویت و تمرکز اصلی نعیم کمک به توانمند سازی خانواده های محروم و به ویژه خانمهای سرپرست خانوار و یا در معرض آسیب است.

□ جهت گیری اصلی نعیم کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای خانگی و کوچک است.

چشم انداز مؤسسه خیریه نعیم در افق ۱۴۱۰، مؤسسه ای است پیشرو و مرجع در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی برای خانواده های نیازمند، مورد شناخت، اعتماد و مشورت خیرین، نهادها و سازمانهای مرتبط، دارای تعاملات کارآمد و تأثیرگذار در سطح کشور و برخوردار از شبکه های ارتباطی فراگیر در داخل و خارج از کشور که عملکرد آن معیاری برای ارزیابی سازمانهای مشابه در سطح ملی و در هر یکاز حوزه های فعالیت خود یکی از برترین ها خواهد بود.

مؤسسه خیریه نعیم، مؤسسه ای است غیر سیاسی، غیر تجاری و غیر انتفاعی که به دنبال این است تا با جلب مشارکتهای عمومی و جذب منابع کارآمد، با پشتیبانی، حمایت و توانمندسازی افراد محروم کشور، به ویژه زنان بی سرپرست و یا در معرض آسیب، در زمینه مهارت آموزی و کمک به کاربایی و اشتغال پایدار آنان، گامی مؤثر در جهت کاهش فقر و رفع مشکلات معیشتی در جامعه هدف بردارد.

این مؤسسه همچنین در جهت تأمین نیازهای معیشتی و ضروری خانواده‌های محروم، از جمله حمایت از تحصیل، تأمین هزینه ازدواج و جهیزیه، ساخت و به سازی مدارس، مساجد، کتابخانه ها و ابنیه عمومی در نقاط محروم نیز با دیگر مؤسسات خیریه مشارکت مینماید. مؤسسه خیریه نعیم با همکاری شرکت کارآفرینی زاگرس و صندوق کارآفرینی امید از دیماه ۱۳۹۸ پروژه ی را تحت عنوان ایجاد اشتغال پایدار با رویکرد بانکداری پیوندی و تأمین مالی خرد در شهرستان خمین برای ۵۲۵ نفر از گروههای آسیب دیده و فقیر با تعهد اشتغال ۶۰ درصد آغاز نموده است.

در این پروژه قرار است ۵۲۵ نفر که ۸۰ درصد آنها فقیرترین فقرای مناطق روستایی و حاشیه شهری خمین تحت ۲۱ صندوق "صندوق های خرد محلی" با تأمین اعتبار تسهیلاتی صندوق کارآفرینی امید نسبت به ایجاد و در نهایت توسعه کسب وکارهای خود در این پروژه ۳ ساله اقدام نمایند.

برای پیشبرد اهداف پروژه و ایجاد تمرکز در ترمینال سازی و هویت بخشی به پروژه به عنوان یک یادگاری از طرف مجموعه های دخیل در برنامه، اقدام به تأمین زمین از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در محل مجتمع فرهنگی ورزشی خمین، برای ایجاد مرکز شتابدهی کسب وکارهای خرد و کوچک (به عنوان اولین مرکز تخصصی کسب وکار و کارآفرینی خصوصی) در ابعاد متوسط نموده است که پس از ساخت مجتمع، اقدام به استقرار واحدهای تولیدی دارای ظرفیت اشتغال بالا در این مرکز و در محوطه نیز اقدام به ایجاد بازارچه هفتگی برای عرضه محصولات در بازارهای گرم و در نهایت ایجاد زنجیره ارزش برای دو محصول کلیدی دارای ظرفیت بازار خواهد شد.

مجتمع کارآفرینی نعیم شامل ۳ بخش اصلی است

کافه کارآفرینی

شتابدهنده

مرکز کسب وکار

در این مرکز کسب وکارهای خرد و متوسط برای یک مدت محدود (تا شکل گیری اولیه)، مستقر شده و نسبت به تولید و عرضه محصول/خدمت خود با مزیت رقابتی اقدام خواهند نمود. ضمناً در این مرکز واحدهای تولیدی، صنفی و کشاورزی محصولات خود را در بازارچه هفتگی پیش بینی شده در محل مجتمع بصورت مستقیم به مشتریان عرضه خواهند نمود.

در این مرکز همچنین فرایند های مشاوره، مانیتورینگ و کوچینگ جهت رشد بهینه و تولید باکیفیت محصولات/خدمات توسط موسسه خیریه نعیم و شرکت کارآفرینی زاگرس ارائه خواهد شد. این مجتمع بعنوان قلب تپنده کسب و کارهای سنتی و فناور محور شهرستان خواهد بود.

همچنین با اخذ مجوز شتابدهنده برای نخستین بار در استان مرکزی برای شهرستان خمین، این مرکز شتابدهی امکان رشد سریع و صحیح شرکت های استارت آپی را مهیا می سازد و از ابتدای کار یک استارتآپ آن را تحت پوشش خود در می آورد. شتابدهنده نعیم با سرمایه گذاری اولیه بر روی شرکتهای نوپا، درصدی از مالکیت آن را در اختیار گرفته و در مقابل به گردانندگان پروژه، آموزشهای لازم برای کسب موفقیت بهتر را ارائه میدهند.

شتابدهنده مجموعه ی کامل از خدمات مورد نیاز برای رشد یک کسب و کار نوپا را نظیر منابع مالی، انواع مشاوره، فناوریهها و تجهیزات مختلف و همچنین فضایی را جهت استقرار شرکت نوپا در یک بازه زمانی تقریباً کوتاه در اختیار استارت آپ های نوپا قرار خواهد داد.

همچنین کافه کارآفرینی فضایی است پویا با امکاناتی از قبیل اینترنت، تلویزیون، محیط پرزنتیشن که در آن تیمها و گروههای مختلف اعم از سرمایه داران، کارآفرینان، صاحبان ایده و... با یکدیگر به تبادل اطلاعات پرداخته و در جهت اجرای پروژه های کاری و نوآورانه با یکدیگر همکاری نمایند.

کافه ها بهترین بستری هستند که میتوانند موجب خلق یک شبکه اجتماعی گسترده تر، متنوع تر و باکیفیت تر بین بازیگران منطقه شوند تا از نهاد آن:

۱- ایده های نوآورانه تری در منطقه شکل گیرد.

۲- بهترین تجربیات و یادگیریها و دانشها از جمله دانش تکنولوژی و بازار به سرعت میان همه منتشر گردد.

۳- با شکل گیری شناخت عمیق بازیگران نسبت به یکدیگر، همکاریهای مشترک جدید و نوآورانه ای میان آنها تعریف شود

گزارش توصیفی:

در پروژه توان افزایش جامعه محلی با رویکرد ایجاد ۲۱ صندوق مالی خرد، هدایت، حمایت و پشتیبانی برای ایجاد و توسعه و پایداری کسب و کارهای خرد با الگوی LNSIE در شهرستان خمین، در راستای اهداف اشتغال پیش بینی شده، پس از ایجاد صندوق ها و تامین منابع مالی برای راه اندازی کسب و کارها، دوره های آموزشی و هدایت شغلی اتفاق خواهد افتاد. در زمینه کسب و کار اولویت اصلی توجه به ظرفیتهای شهرستان با توجه به تقاضای بازار می باشد و اولویت های بعدی نیاز بازار شهرستان و استان و حتی ملی مد نظر قرار خواهد گرفت و کسب و کارهای بر محوریت تولید تا عرضه پیاده سازی خواهد شد.

برای رسیدن به اهداف پروژه، طبق پیش بینی های صورت گرفته لزوم تربیت تسهیلمان محلی برای ورود به روستاها و محلات و تشکیل گروههای همتا برای ایجاد صندوق ها بسیار اهمیت دارد. بهمین منظور در فاز اول پروژه اقدام به شناسایی تسهیلمان، آموزش تسهیلمان در دو فاز آموزش تسهیلمگری محلی و آموزش ایجاد صندوق های خرد مالی همتا انجام گردیده است. همانطور که در گزارش قبلی اشاره شد در این دوره های ۴ روزه، تعداد ۱۴ نفر از فعالان مدنی و اجتماعی شهرستان شرکت نمودند که در نهایت با ظرفیت سنجی تسهیلمان با تعداد ۷ نفر از تسهیلمان برای ایجاد ۲۱ صندوق در ۹ روستا و ۶ محله آسیب دیده یا در معرض آسیب خمین و ۳ ناظر محلی پروژه ها در سطح روستاها و محلات و یک تسهیلمگر ارشد برای مدیریت پروژه در سطح شهرستان اقدام به عقد قرارداد گردید.

در جهت پیشبرد اهداف پروژه جلسات متفاوتی در سطح شهرستان و استان و همینطور در مرکز کشور اجرا با مجموعه ها و نهادهای مختلف به شرح ذیل برگزار گردیده است. در زمان تنظیم گزارش، بر اساس نقشه راه پروژه، روستاها و محلات اجرای پروژه مشخص و اولین ورود محلی توسط تسهیلمان انجام گردیده است. اسناد و مدارک تشکیل گروه تحویل تسهیلمان داده شده است. تفاهم نامه تامین تسهیلات با صندوق کارآفرینی امید در مرحله عقد می باشد و دوره های آموزشی در دو مرحله دو روزه برای تسهیلمان و ناظران طرح در شهرستان برگزار گردیده است. (گزارش دوره ها به پیوست می باشد)

در اسفند ماه ۹۸ و فروردین و نیمه اردیبهشت ماه ۹۹ بدلیل شیوع غیر منتظره کرونا و اقدامات پیشگیرانه و قرنطینه کشور باعث شد فرایند اجرایی پروژه در سطح شهرستان خمین تا ۸۰ درصد تعطیل شود. در این مدت تعطیلی فرصت لازم جهت بررسی روستاها و محلات و شناسایی آسیب های موجود در آنها و تهیه نقشه منابع اجتماعی و اکولوژیکی آماده گردید و تیم اجرایی از طریق فضای مشترک مجازی روند انجام فعالیتهای را در مناطق تایید شده برای ایجاد صندوق ها پیگیری و به اشتراک قرار دادند. در طول این مدت که محدودیتهای به نسبت شدیدی برای ورود به محلات و روستاها اعمال میگردد تسهیلمان توانستند از طریق رابطان محلی و

روستایی اقدام به شناسایی اعضای گروههای همتا و دریافت مدارک و تکمیل فرم های مربوط اقدام نمایند. در محلات فیروز، گوشه، شاهین، بلوار صدوقی، محله شهرک مهر، محله احمدآباد و محسن آباد تقریباً اعضای گروهها مشخص و ثبت گردیده اند. علاوه بر محلات در روستاهای خراوند، قلعه حیدر، جوادیه، سرکوبه، جهان قلعه و روستای سوک اعضای گروهها مشخص شده اند. فقط روستاهای داودآباد، قلعه بابی و سیف الدین بدلیل محدودیتهای شدید و مقاومت های اهالی برای ورود تسهیلگر عملیات شناسایی به کندی پیش می رفت که با حضور مجری طرح در روستاها و هماهنگی با اعضای شورا و دهیاران مقرر گردید تا اواخر اردیبهشت ماه ۹۹ و اتمام ماه مبارک رمضان، نسبت اقدامات لازم جهت حضور تسهیلگر را در روستاها تمهیداتی اعمال گردد.

در طول مدت درگیری منطقه با بحران کرونا، مجری طرح یک جلسه با جهادکشاورزی جهت پیشبرد و کمک به شناسایی رابطان روستاها و یک جلسه با صندوق کارآفرینی امید شهرستان خمین و دو جلسه با تیم تسهیلگران و یک جلسه با خانم مهندس کشاورز مدیر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید در تهران جهت پیگیری مسایل حقوقی تفاهم نامه داشتند که صورت جلسات به پیوست گزارش آمده است.

در طول مدت تعطیلی فعالیتهای ایجاد صندوق ها، شرکت زاگرس با تامین مالی و حمایت های موسسه نعیم، ایجاد کارگاه تولید ماسک را با اشتغال ۸ نفر در شهر خمین عملیاتی نموده است.

و در ادامه از ۱۷ اردیبهشت تا ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ :

در فاصله زمانی دوماهه از گزارش سوم تا چهارم یک جلسه حضوری در خدمت تسهیلگران و بررسی روند ورود به جامعه محلی بوده و با پیگیری های صورت گرفته روستای چهارچشمه و سرکوبه را دوباره بازدید و از خیریه حضرت رسول اکرم و دارالاکرام نیز جلساتی تلفنی برای معرفی جامعه هدف خود به طرح برقرار شد.

همچنین تفاهم نامه مشترک با صندوق کارآفرینی بالاخره در خردادماه ۹۹ با تغییر مسئولیت از استان به ستاد صندوق کارآفرینی امید با امضای مدیریت توانمندسازی صندوق خانم مهندس کشاورز منعقد و جهت اجرا به استان و شهرستان خمین ابلاغ گردید.

در اوایل خرداد ماه جلسه ی مشترک با تسهیلگر شهرستان خانم محمودی و ریاست صندوق کارآفرینی امید شهرستان خمین آقای نوروزی برگزار و روند بانک پذیری صندوق های ایجاد شده بررسی و لزوم تسهیل افتتاح حساب و عدم حضور اعضای روستایی به دلیل فاصله زیاد و همچنین مراجعه کارشناسان صندوق امید به روستاها بررسی و تصویب گردید.

مشکل اساسی در روند بانک پذیری صندوق های محلی با نامه نگاری و تهیه دستورالعمل مجزا با تایید ستاد به شهرستان ابلاغ گردید که تسریع را در مدت زمان افتتاح حساب، مبلغ افتتاح حساب و مدل معرفی صندوق ها از طرف زاگرس را همراه داشت.

در خرداد و تیرماه ۹۹ تعداد ۱۶ صندوق از ۲۱ صندوق مورد تعهد توانستند در صندوق کارآفرینی امید شهرستان افتتاح حساب داشته و تقریباً ۵۰ درصد اعضا نیز بصورت شخصی در آن موسسه اقدام به افتتاح حساب نمودند.

۵ صندوق باقیمانده نیز به دلیل مشکلات ریزش اعضا و اقدام دوباره برای دوباره جذب، طی معرفی نامه ارسالی به صندوق کارآفرینی امید شهرستان، در اوایل مردادماه به بانک معرفی خواهند شد.

بر اساس برنامه و گانت اجرایی، دوره آموزش دو روزه ارکان صندوق های مالی خرد محلی و روستایی همتای نعیم با پیگیری های صورت گرفته از طریق فرمانداری و کسب مجوز های لازم از شبکه بهداشت شهرستان، در تاریخ ۱ و ۲ تیرماه در محل هتل امام رضای خمین برگزار گردید و در این دوره خانم دکتر نوشادی تسهیلگر ارشد برنامه و خانم محمودی تسهیلگر شهرستانی و آقای نوروزی رئیس صندوق کارآفرینی امید، اقدام به تدریس سرفصل های مربوط به حسابداری و مدیریت صندوق ها را داشتند. در این دوره تعداد ۶۱ نفر از ارکان صندوق های مالی خرد محلی و روستایی به مدت دو روز و ۱۶ ساعت، آموزشهای لازم برای ثبت و ضبط مالی، مدیریت صندوق، ثبت رویدادهای ماهیانه صندوق و ... را فراگرفتند.

بعد از دوره یک نفر از تسهیلگران خانم صفری به دلیل بیماری امکان همراهی برنامه را نداشتند و تسهیلگر دیگری به نام خانم درویشی ادامه کار ایشان را در محلات مشخص شده به عهده گرفتند.

در طول مدت دوماه گذشته، شرکت زاگرس به همراهی یک گروه خوب محلی، مدرسه غیر فعال در یکی از محلات حاشیه ی شهر را از طریق آموزش و پرورش بصورت اجاره ی در اختیار گرفتند که در فاز اول با تجهیز سالن تولید برای پرورش جلبک و تسری آن برای توسعه اشتغال محلی و در فاز دوم به عنوان مرکز خدمات کسب و کار خانگی تجهیز و در اختیار جامعه اعضای صندوق ها قرار خواهد گرفت.

آقای مهندس مومنی مدیرعامل محترم موسسه خیریه نعیم در اوایل تیرماه بازدید از روند برگزاری دوره ی آموزشی و آشنایی با مجموعه ارکان صندوق ها و تسهیلگران را داشتند.

و در ادامه از ۲۴ تیرماه تا ۱۴ شهریور ماه ۹۹:

در طول مدت حدودا دوماه از ۲۵ تیرماه و ۱۴ شهریور ماه ۹۸ بعد از دوره آموزشی ارکان، روند تشکیل جلسات ماهیانه اعضای صندوق منظم تر و با توجه به استقبال زیادی که در بعضی از محلات و روستاها از پروژه بود در ۵ صندوق تعداد اعضا به ۳۰ نفر نیز رسید. در این مدت دوماهه، تعداد صندوق های تشکیل شده و افتتاح حساب شده از ۱۶ صندوقی که در کارآفرینی امید حساب باز کرده بودند

به تعداد ۱۹ صندوق رسید. که دو صندوق اضافه شده در روستای ورآباد و شهابیه می باشند و دو صندوق باقیمانده نیز عضو گیری ها انجام شده که به امید خدا در هفته آخر شهریور ماه جهت افتتاح حساب به کارآفرینی امید معرفی خواهند شد.

بازدید ها و جلسات هفتگی با تسهیلاتگران مرتبا با حضور آقای فرهودی و تسهیلاتگر شهرستانی خانم محمودی و خانم نوشادی تسهیلاتگر ارشد خمین برگزار گردیده و مسایل و مشکلات صندوق ها مرتفع گردیده است.

در کل دو ماه گذشته تعداد ۹ جلسه با ریاست صندوق کارآفرینی امید خمین در جهت حل و فصل مسایل و نواقص پرونده ی صندوق های افتتاح حساب شده برگزار گردیده و که در این ۴ جلسه آقای فرهودی حضور داشتند و ۵ جلسه با حضور خانم محمودی تسهیلاتگر شهرستانی و صندوق کارآفرینی امید برگزار شده است.

در جهت پیشبرد اهداف پروژه و سعی در شناخت از ویژگیها و ظرفیتهای اعضا صندوق ها خرد مالی روستایی و شهری خمین ، از تاریخ ۲۰ مرداد تا ۳۱ مرداد ، آقای فرهودی مستمر در خمین حضور داشتند و در ۱۸ صندوق تشکیل شده در روستاهای چهارچشمه، سرکوبه، حسین آباد-رضآباد ، آشناخور ، شهابیه و ورآباد و از صندوق های ایجاد شده در محلات عباس آباد، احمدآباد، گوشه، صندوق های ایجاد شده در دو خیریه حضرت رسول و دارالاکرام و همینطور صندوق جوانان و معلولین بازدید و با تک تک اعضای صندوق ها مشاوره و فرم نیازسنجی شغلی و مهارتی را تکمیل نمودند. فقط از روستای میشیجان سفلی بدلیل وضعیت حاد کرونا در آن روستا و درگیری چند نفر از اعضای صندوق ،بازدید به اواخر شهریورماه موکول گردید.

در کل این بازدید ها تعداد با ۴۳۰ نفر از اعضای صندوقهای خرد مالی مشاوره مستقیم انجام شد و شناخت خوبی نیست به توانمندیهای اعضا احصا گردید.

با تجمیع پس انداز ها و نزدیک شدن به سپرده ۵ میلیون تومانی هر صندوق در کارآفرینی امید مقرر گردیده از اوایل مهر ماه نسبت به پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی اقدام شود.

در ادامه از ۱۴ شهریور تا ۱۴ آبان ماه ۹۹ :

در طول مدت دو ماه از اواسط شهریور تا اواسط آبانماه ، در جهت پیشبرد اهداف پروژه ، جلسات متعددی با صندوق کارآفرینی امید شهرستان خمین، مدیران شهرستانی (نماینده شهرستان، آموزش و پرورش، شورای شهر، دهیاران) ، تسهیلاتگران و صندوق های ایجاد شده انجام گردید. روستاهای کفسان و فرنگ، حشمتیه، اسدآباد و میشیجان علیا به پروژه اضافه شدند و تعداد ۲۱ صندوق خمین کامل شد. جلسات ماهیانه صندوق ها طبق روال گذشته تا حضور تسهیلاتگران و ارکان و ۲ سوم اعضا طبق دستورالعمل برگزار و پس اندازهای ماهیانه جمع آوری و به حساب صندوق ها در کارآفرینی امید واریز گردید.

در طول مدت دوماه گذشته، دوره های آموزش تربیت مربی کارآفرینی با الگوی LNSIE و به تبع آن آموزش های مهارتهای کسب و کار در صندوق ها توسط مربیان آموزش دیده اجرا گردید.

تعداد ۲ دوره آموزشی شامل تربیت مربی مهارتهای زندگی شغلی با الگوی ۴H طی یک روز ، دوره تربیت مربی خلق ایده و اعتبار سنجی طی یک روز ، و دوره تربیت مربی خلق مدل کسب و کار در طول دو روز در محل سالن آموزشی صندوق مهدیه با حضور ۲۵ نفر از مربیان گزینش شده که شامل روسای صندوق های خمین، تسهیلاتگران و تعدادی از خبرنگاران هر صندوق بودند برگزار گردید. مربیان آموزش دیده ، دوره اول خود را شامل مهارتهای زندگی شغلی با برابند تهیه طرح زندگی و دوره خلق ایده با برابند خلق ایده و اعتبارسنجی آن برای ۳۸۰ نفر از اعضای صندوق های خرد مالی محلی و روستایی برگزار نمودند.

دوره دوم آموزش در صندوق ها نیز از ۲۰ تا ۳۰ آبانماه در روستاها و محلات مختلف که صندوق تاسیس شده است برگزار خواهد شد. ۱ صندوق خرد محلی (احمدآباد) با تجمیع پس اندازها و رسیدن آن به مبلغ ۵ میلیون تومان در بازدید آقای فرهودی و آقای نوروزی مدیر صندوق کارآفرینی امید خمین اعتبار سنجی و اسناد و مدارک مالی گروه بررسی گردید. این صندوق برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومان مرحله اول به صندوق کارآفرینی امید معرفی گردید و در مرحله تشکیل پرونده تسهیلات می باشد. ۴ صندوق دیگر شامل ۲ صندوق محلی و ۲ صندوق روستایی (آشنا خور و رضا آباد) آماده اعتبار سنجی می باشند که در اواخر آبانماه توسط تیم ارزیاب ، انجام خواهد شد.

و در ادامه از ۱۴ آبان ماه تا ۱۲ آذر ماه ۹۹ :

در طول مدت یک ماه از اواسط آبان تا اواسط آذرماه ، در جهت پشبرد اهداف پروژه ، جلسات متعددی با صندوق کارآفرینی امید شهرستان خمین در خصوص روند پرداخت تسهیلات و فنی و حرفه ای شهرستان در جهت معرفی اعضای صندوق ها برای دوره های آموزشی پیش بینی شده بر اساس ایده های اعتبار سنجی شده اعضا انجام گردید. همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به همراه معاونت های اشتغال ، اجتماعی و پشتیبانی با حضور در محل مجتمع خدمات کسب و کار، نسبت به بازدید و ارائه پیشنهادات برای بهتر شدن روند ایجاد، مجوز شتابدهنده نعیم را نیز حضورا تقدیم کردند. با حذف روستای حشمیته بدلیل عدم همراهی جامعه محلی، روستای سکانه نیز بعنوان روستای جدید نیز به پروژه اضافه شد و مقدمات تشکیل صندوق در بازدید میدانی از روستا با حضور دهیار و اعضای شورای روستا پایه گذاری گردید. جلسه ی هم با حضور معتمدین و بانوان روستا در منزل یکی از روستاییان برگزار شد و تسهیلاتگر زاگرس نسبت به تبیین اهداف صندوق و شناسایی اعضای احتمالی اقدام نمودند. تعداد صندوق ها با شکل گیری

صندوق سکانه به ۲۱ صندوق میرسد جلسات ماهیانه صندوق ها طبق روال گذشته با حضور تسهیلاتگران و ارکان و ۲ سوم اعضا طبق دستورالعمل برگزار و پس اندازهای ماهیانه جمع آوری و به حساب صندوق ها در کارآفرینی امید واریز گردید.

در طول مدت یکماه گذشته، دوره های آموزش دوره دوم مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی با مدل LNSIE برای اعضای صندوق های محلی و روستایی با تدریس مربیان آموزش دیده انجام گردید.

همچنین طی دو جلسه با سرکار خانم کشاورز مدیر محترم توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید کشور، نسبت به بررسی وضعیت صندوق های محلی خمین و افزایش مبلغ تسهیلات بر اساس شیوه نامه تا ۱۰۰ میلیون تومان، توافقات لازم صورت پذیرفت و ایشان طی نامه ی دستورات لازم را منتقل نمودند.

تعداد ۱۲ صندوق محلی و روستایی اعتبار سنجی شده و برای دریافت تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید شهرستان خمین معرفی شدند. صندوق های محلات شهری شامل عباس آباد، حضرت رسول ۱ و ۲ و ۳، دارالاکرام ۱ و ۲، کارورزان، کارجویان و صندوق مهر (خانواده توانخواهان خمین) و همینطور صندوق های روستایی چهارچشمه، سرکوبه و شهابیه ضمن اعتبار سنجی مقدمات معرفی به صندوق کارآفرینی امید جهت ثبت در سامانه کارا انجام گردید. تا نیمه اول اذرماه ۹۹ مجموع ۱۵ صندوق به مرحله دریافت تسهیلات رسیده اند و تعداد ۶ صندوق هم در اواخر اذرماه با تجمیع منابع مالی به بیش از ۵ میلیون تومان مقدمات اعتبار سنجی و معرفی برای دریافت تسهیلات انجام خواهد شد.

و در ادامه از ۱۲ آذر ماه تا ۱۰ اسفند ماه ۹۹ :

در طول مدت سه ماه از اواسط آذرماه تا اواسط اسفندماه، در جهت پیشبرد اهداف پروژه، در کنار ارائه خدمات مشاوره و بررسی طرح های کسب و کار اعضا، بیشترین تمرکز بر روی پرداخت تسهیلات به صندوق ها گذاشته شد. در این راستا جلسات متعددی با صندوق کارآفرینی امید شهرستان خمین و صندوق کارآفرینی امید کشور در خصوص روند پرداخت تسهیلات و ارزیابی اولیه صندوق ها و همینطور سازماندهی متقاضیان تسهیلات در هر صندوق انجام شد. جلسات توجیهی متعددی با ارکان صندوق ها برگزار شد که هم با روند پرداخت و دریافت تسهیلات آشنا شوند و هم بتوانند تسهیلات و متقاضیان تسهیلات را در سامانه صندوق کارآفرینی امید ثبت و ضبط نمایند. حضور دو روز در هفته در خمین طبق روال انجام شده و از نزدیک در جریان برگزاری جلسات صندوق ها و اتفاقات مهم کسب و کاری و ایده های کسب و کار قرار گرفته شد. در طول این سه ماه، دو صندوق شامل صندوق روستای ورآباد و صندوق خیریه

حضرت رسول بدلیل عدم همکاری اعضا با اینکه نزدیک به دریافت تسهیلات بودند حذف شدند و صندوق های روستای فرنگ ، روستای قلعه آشنا خور و دو صندوق فعالان صنایع دستی و قالی بافان تشکیل و به مرحله افتتاح حساب رسیدند.

یک تسهیلاتگر جدید خانم حسنی کیا نیز به تیم زاگرس اضافه شدند که مسئولیت صندوق قلعه آشنا خور را به عهده دارند.

در طول سه ماه ۵ صندوق موفق به دریافت تسهیلات شدند که رقم تسهیلات پرداختی از طرف صندوق کارآفرینی امید ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بوده که از این مبلغ تعداد ۵۷ کسب و کار با اشتغال ۷۸ نفر ایجاد شده است. تعداد ۸ صندوق در نوبت پرداخت تا آخر سال قرار دارند که در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۳ صندوق با پیش بینی ۲۳۰ کسب و کار تامین اعتبار شوند.

در خصوص مرکز خدمات کسب و کار نیز پس از بررسی های انجام شده مقرر گردید با هماهنگی موسسه خیریه نعیم نسبت به اجاره و رهن مکان ۴۰۰ متری اقدام گردد که فرایند کار با تامین اعتبار موسسه نعیم تا قبل از سال انجام خواهد شد.

با توجه به اینکه تعدادی از اعضای صندوق ها علاقه زیاد به گلیم بافی داشتند و نیاز به برگزاری دوره آموزش تخصصی حوزه گلیم بخصوص گلیم های سه بعدی احصا شد لذا با هماهنگی شرکت زاگرس ، مربی ارشد گلیم خانم سعید پور از میاندوآب استان اذربایجان غربی به مدت سه روز در خمین دوره آموزشی روانشناسی رنگ در صنایع دستی و مدل ها و الگوهای متنوع گلیم های تجاری برگزار کردند که تعداد ۳۲ نفر از اعضای صندوق ها در این دوره که در محل کارگاه قالی بافی خانم اکبری برگزار شد حضور داشتند.

و در ادامه از ۱۰ اسفند ماه ۹۹ تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ :

در طول مدت ۴ ماه از اواسط اسفند ماه ۱۳۹۹ تا اواسط تیرماه ۱۴۰۰، در جهت پشبرد اهداف پروژه ، در کنار ارائه خدمات مشاوره و بررسی طرح های کسب و کار اعضا، بیشترین تمرکز بر روی پرداخت تسهیلات به صندوق ها و عملیات ساخت مجتمع خدمات کسب و کار خمین گذاشته شد. در این راستا جلسات متعددی با صندوق کارآفرینی امید شهرستان خمین و صندوق کارآفرینی امید کشور در خصوص روند پرداخت تسهیلات و ارزیابی اولیه صندوق ها و همینطور سازماندهی متقاضیان تسهیلات در هر صندوق انجام شد. شیوه نامه جدید پرداخت تسهیلات در اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق صندوق کارآفرینی امید ابلاغ شد که میزان تسهیلات برای صندوق های شهری از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. جلسات توجیهی متعددی با ارکان صندوق ها برگزار شد که هم با روند پرداخت و دریافت تسهیلات آشنا شوند و هم بتوانند تسهیلات و متقاضیان تسهیلات را در سامانه صندوق کارآفرینی امید ثبت و ضبط نمایند. حضور یک روز در هر دو هفته در خمین طبق روال انجام شده و از نزدیک در جریان برگزاری جلسات صندوق ها و اتفاقات مهم کسب و کاری و ایده های کسب و کار قرار گرفته شد. در طول این چهار ماه، یک صندوق حضرت رسول اکرم بدلیل عدم

همکاری اعضا با اینکه در مرحله دریافت تسهیلات بودند در حال کنسل شدن است و صندوق های روستای رشید آباد، روستای کبکه و دو صندوق قالی بافان و خیاطان خمین تشکیل و به مرحله افتتاح حساب رسیدند.

مسئولیت صندوق های جدید بر عهده خانم ها صمدی و طهماسبیان می باشد.

در طول پروژه ۱۵ صندوق موفق به دریافت تسهیلات شدند که رقم تسهیلات پرداختی از طرف صندوق کارآفرینی امید ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بوده که از این مبلغ تعداد ۲۱۳ کسب و کار با اشتغال ۲۸۱ نفر ایجاد شده است. تعداد ۳ صندوق در نوبت پرداخت تا آخر مهرماه قرار دارند و تعداد ۳ صندوق نیز با توجه به حذف صندوق های قبلی در مرحله شناسایی و ایجاد هستند.

در خصوص مرکز خدمات کسب و کار نیز پس از بررسی های انجام شده مقرر گردید با هماهنگی موسسه خیریه نعیم نسبت به اجاره و رهن مکان ۴۰۰ متری اقدام گردد که فرایند بازسازی ساختمان از اردیبهشت ماه شروع شده و تا تاریخ ارائه گزارش در مرحله نازک کاری و تاسیسات می باشد.

تمام اقساط پرداختی صندوق کارآفرینی امید شهرستان به صندوق ها بدون معوق در حال بازپرداخت می باشد و هر ماه از محل مابه تفاوت بازپرداخت اقساط بانکی، تسهیلات جدید به اعضای صندوق ها در حال پرداخت می باشد.

در اوایل خرداد ماه، مدیرعامل محترم موسسه خیریه نعیم به همراه مدیرعامل شرکت کارآفرینی زاگرس جلسه ای را در کارگروه اشتغال شهرستان خمین با حضور مسئولین شهرستانی و فرماندار شهرستان داشتند که روند اجرای کار و برنامه های آتی بیان شد و مقرر گردید درخواست زمین برای احداث مجتمع ارائه شود که در اواسط خرداد درخواست به فرمانداری ارائه شد.

در ادامه از ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ تا ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰

در طول مدت ۸ ماه گذشته، تعداد صندوق های جدید ایجاد شده ۳ صندوق در دو بخش محله شهری بوده که مجموع صندوق های تشکیل شده تا این مرحله از پروژه ۱۹ صندوق تشکیل و ۱۶ صندوق به مرحله تسهیلات رسیدند. کل مجموع افراد کم برخوردار عضو صندوق های خرد روستایی و شهری همتای نعیم ۴۸۶ نفر می باشند. دو صندوق از صندوق های قبلی منحل شدند و سه صندوق جایگزین گردید. جلسات داخلی صندوق ها هر ماه یکبار برای مشورت و جمع آوری پس اندازها و دریافت درخواست متقاضیان تسهیلات کمافی السابق برگزار گردید. جلسات بین شرکت کارآفرینی زاگرس و صندوق کارآفرینی امید در خصوص تسهیل روند پرداخت تسهیلات مداوم به صورت حضوری یا تلفنی برگزار گردید. عملیات بهسازی و بازسازی مجتمع نعیم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به اتمام رسید و تحویل موسسه خیریه شد و سه کسب

وکار نیز در کارگاههای ایجاد شده شامل تولیدی پوشاک، آموزشگاه نقاشی و کارگاه مصنوعات چرمی (هر سه از اعضای صندوق های تشکیل شده بودند) مستقر گردیدند. تجهیزات کافه کارآفرینی، فضای اداری، فضای کار اشتراکی و اتاق جلسات نیز خریداری و مجهز گردید.

در آبانماه ۱۴۰۰ با حضور مسئولین شهرستانی، اعضای صندوق ها، تسهیلمان، خیرین و اعضای هیات مدیره نعیم مجتمع افتتاح گردید و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود. در حاشیه افتتاحیه مجتمع، اعضای هیات مدیره و تیم همراه نعیم، از کسب و کارهای ایجاد شده در نواحی روستایی و حاشیه ی شهری خمین بازدید نمودند. این مجتمع با هزینه بالغ بر ۸ میلیارد ریال از محل حمایت های مالی نعیم تاسیس گردید و خدمات ارزنده ای را در راستای اهداف توانمندسازی برای اقشار کم برخوردار و آسیب دیده و آسیب پذیر شهرستان خمین خواهد داشت. در ادامه از آبان ماه، دوره های آموزشی مکمل حرفه ای در حوزه های طراحی و برند سازی پوشاک با مربی گری خانم مهندس ناصریان فعلی از تهران، دوره آموزش حرفه ای طراحی و دوخت مصنوعات چرمی با مربی گری خانم نوریان از خرم آباد و همینطور دوره حرفه ای بازاریابی دیجیتال و تجاری سازی محصولات با مربی گری آقای مهندس فلکدین از تهران، در مجتمع برگزار گردید و استقبال خوبی نیز از برنامه های آموزشی شد. رویداد ایده شو بر اساس ظرفیت های سرمایه گذاری در خمین نیز در آذرماه ۱۴۰۰ برگزار شد و تعداد ۵۲ نفر ایده های خود را در سامانه ثبت کردند و از بین آنها ۵ ایده برتر انتخاب و کار پایش آنها توسط تیم مجری انجام شد و قرار شد بر اساس مدل کسب و کار ارائه شده از حمایت های معنوی و مالی موسسه نعیم و صندوق کارآفرینی امید برخوردار شوند. همچنین در بهمن ماه ۱۴۰۰ جلسه ی با حضور سرگروه های هر صندوق تسهیلمان و مجری طرح برگزار شد که مقرر گردید بدلیل به حد نصاب رسیدن تعداد صندوق ها و رایزنی با صندوق کارآفرینی امید و جلب موافقت، صندوق شهرستانی تشکیل شود که در مرحله تنظیم اساسنامه و آیین نامه داخلی می باشد. با توجه به ایجاد کسب و کارها و لزوم پایش آنها و عارضه یابی مشکلات احتمالی، منتور ارشد شرکت زاگرس به مدت ۶ روز از تمام کسب و کارهای ایجاد شده در نواحی روستایی و شهری بازدید و مشاوره های الزم را برای بهبود وضعیت کسب و کارها و تسهیل روند رشد آنها در محل کسب و کار به آنها ارائه داد. در نهایت طی گزارش اخذ شده از صندوق کارآفرینی امید شعبه خمین، تعداد ۴۴۳ شغل از طریق تسهیالت ایجاد شده است و مجموع کل تسهیالت پرداختی ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بوده است و همچنین آورده خود صندوق ها از محل پس اندازهای ماهیانه بالغ بر ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰

تومان می باشد که پس اندازه‌های داخلی نیز بصورت تسهیالت برای ایجاد یا توسعه کسب و کار به اعضا پرداخت شده است. همچنین برند شانشین با حمایت مالی مجری و صندوق خرد روستای حسین آباد با مدیریت خانم فاطمه هاشمی ثبت گردید.

ادامه پیشرفت پروژه از اسفند ۱۴۰۰ تا آذرماه ۱۴۰۲

در طول ۲ سال از آخرین گزارش ارائه شده به موسسه خیریه نعیم، اقدامات متنوعی در فرایند پروژه و همینطور فعالیتهای مرکز خدمات کسب و کار نعیم انجام شده است.

در این مدت، بازدید از کسب و کارها، جلسات مختلف با حضور ارکان، اعضا و مربیان کارآفرینی آموزش دیده در خمین، هماهنگی بازدید مدیران کشوری و استانی و شهرستانی از مجتمع و کسب و کارها، پرداخت تسهیلات تکمیلی به صندوق های شهری و پرداخت تسهیلات به اعضای صندوق های روستایی، برگزاری دوره های آموزشی منطبق بر نیاز اعضای صندوق ها و ... انجام گردیده است.

همچنین در طول این مدت ۸ صندوق خرد روستایی با وجود تشکیل، افتتاح حساب و حتی تامین تسهیلات از ادامه کار انصراف دادند که جایگزین کردن این صندوق ها به دلایل مختلف همچون عدم همکاری دهیاران، وجود مجموعه های موازی در روستاها و... انجام نشد.

در مجموع بر اساس آخرین گزارش دریافتی از شهرستان خمین، تعداد ۱۲ صندوق پابرجا و جلسات ماهیانه مداوم برگزار می شود. صندوق رضآباد به عنوان صندوق برتر استانی به رویداد روستایی شو راه پیدا کرد و صندوق های دیگر هم با همکاری همدیگر محصولات جذاب و خدمات ارزشمندی را ارائه میدهند.

در این مدت یک دوره کامل ۱۰۰ ساعته صفر تا صد کارآفرینی با الگوی LNSIE برای بیش از ۴۰ نفر از اعضا و متقاضیان کسب و کار با تدریس اساتید آقای دکتر ترابی کمال و خانم دکتر کتایون سپهری برگزار شد که گواهینامه فراگیران دوره توسط شرکت کارآفرینی زاگرس صادر گردید.

در بهمن ماه ۱۴۰۱ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید آقای دکتر رضایی ضمن بازدید از مجتمع خدمات کسب و کار خمین با حضور مدیریت صندوق امید استان مرکزی و شهرستان و همینطور بخشدار مرکزی خمین، ضمن بررسی صندوق های مالی خرد ایجاد شده، موافقت لازم با پرداخت تسهیلات تکمیلی از محل منابع داخلی و تبصره ۱۸ را صادر نمودند که

متعاقب آن تعداد ۸ صندوق شهری هر کدام مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان تسهیلات مازاد بر تسهیلات مرحله اول دریافت نمودند. همچنین با هماهنگی کمیته امداد کشور، برای صندوق های روستایی به ازای هر نفر مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان مصوبه پرداخت اخذ گردید که تعداد ۱۶ نفر از اعضای صندوق های رضا آباد و آشناخور موفق به دریافت شدند. در این مدت مدیرعامل شرکت زاگرس، هر ماه حداقل دو روز در خمین حضور داشتند و ضمن برگزاری جلسات شهرستانی، در صورت نیاز اعضای صندوق ها، مشاوره های لازم را ارائه نمودند.

در تابستان ۱۴۰۲ هماهنگی برگزاری جلسه و بازدید از چند کسب و کار را به همراه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت زردبند انجام شد و ضمن برگزاری یک دوره آموزش گیاهان دارویی، از چند روستا و کسب و کارهای ایجاد شده نیز بازدید بعمل آوردند. در طول این مدت، چندین جلسه با بخشدار مرکزی خمین، اداره کار خمین، جهادکشاورزی و معاونت توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در محل مجتمع خدمات کسب و کار در خصوص روند فعالیتها، اشتغال های ایجاد شده، حمایت های دستگاهها برگزار گردید. همچنین رئیس اداره کار خمین و همکاران جهادکشاورزی و فرمانداری بازدیدی از کسب و کارهای ایجاد شده در روستاهای آشناخور و رضاآباد بعمل آوردند.

در جهت خدمات توسعه کسب و کار در خمین، درخواست ایجاد پردیس پارک علم و فناوری به پارک استان ارائه شد و همکاران پارک از مجتمع بازدید و مقرر گردید تفاهم نامه ی در این خصوص با شرکت کارآفرینی زاگرس و موسسه خیریه نعیم منعقد گردد و همچنین مقدمات ایجاد خانه خلاق و نوآوری در خمین انجام و با سختی های زیاد به مرحله عقد تفاهم نامه رسید که با نظر موسسه خیریه نعیم هنوز به مرحله عقد تفاهم نامه نرسیده است. پیگیری های پرداخت تسهیلات مکمل، تسهیلات فردی فرصت و زمان زیادی را از تیم زاگرس گرفت که به لطف خدا مبلغ ۳ میلیارد تومان را مجدداً به صندوق ها و اعضای آنها تامین گردید. برندسازی محصولات غذایی شانشین در صندوق رضاآباد و حضور موثر این صندوق در بازار خمین و استانهای اطراف از دیگر فعالیت های انجام شده در طول مدت دوسال گذشته می باشد.

در طول مدت دو سال تعداد ۲۴۰ جلسه ماهیانه توسط صندوق ها برگزار گردید و ضمن جمع آوری پس اندازها، تسهیلات لازم برای طرح های معرفی شده از طرف اعضا پرداخت شده است همچنین در ادامه مانیتورینگ کسب و کارها، آقای خیرآبادی کارشناس کسب و کار خرد با حضور ۴ روزه در خمین، از کسب و کارهای روستایی و محلی بازدید و مشاوره های لازم را ارائه نمودند.

جدول ۱: همکاران پروژه و تسهیلگران

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام روستا یا محله	شماره تلفن
۲	خورشید بیات	روستای چهارچشمه	۰۹۱۸۷۶۵۰۵۵۴
۳	پروانه مرتاضی	روستای سرکوبه	۰۹۱۸۵۲۷۴۲۴۰
۴	سمیه مردانی	خیریه دارالکرام	۰۹۱۸۹۶۶۸۱۶۳
۵	فاطمه امیدی	کارجویان و کارورزان	۰۹۱۸۸۶۶۵۴۵۷
۶	مریم صمدی	محله احمدآباد و محله محسن آباد و معلولان	۰۹۱۸۹۶۶۶۲۸۰
۷	طاهره طهماسیان	روستای آشنا خور، روستای حسین آباد - رضا آباد، محله عباس آباد و محله قیام	۰۹۱۸۹۶۶۱۲۹۴

جدول ۲- اسامی مدیر و کارشناسان طرح

مجری پروژه	وحید فرهودی	هر دو هفته یک روز در خمین
تسهیلگر ارشد ملی مجری	سمیه نوشادی	پاره وقت
تسهیلگر شهرستان	بتول محمودی	پاره وقت - بعد از ظهرها مستقر در دفتر
کارشناس مشاوره کسب و کار	کتایون سپهری	پاره وقت - مشاوره تلفنی و مجازی
کارشناس مشاور بازار	علیرضا فلکدین	پاره وقت

جلسات مهم برگزار شده در راستای پروژه از شروع پروژه تا تاریخ تنظیم گزارش

ردیف	عنوان جلسه	نوع جلسه	تاریخ	حاضرین	محل جلسه
۱	جلسه با رئیس آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خمین	رسمی اداری - در راستای عقد تفاهم نامه	۹۸/۱۰/۱	آقای نصیری رئیس اداره، آقای میر خان همکار نعیم، آقای وحید فرهودی مجری پروژه	اداره فنی و حرفه ای شهرستان خمین
۲	جلسه با موسسه خیریه حضرت رسول	غیر رسمی در جهت شناخت ظرفیتهای خیریه آل طاهر	۹۸/۱۰/۱	خانم آل طاهر مدیرخیریه، آقای میرخان همکار نعیم، آقای فرهودی مجری پروژه، تعداد ۲۵ نفر از مددجویان خیریه	دفتر موسسه خیریه در خیابان قیام
۳	جلسه با تعدادی از خبرگان اجتماعی شهرستان	غیر رسمی رای هم اندیشی و تشکیل هسته اولیه تسهیلاتگران در خمین با هماهنگی جهاد کشاورزی و حضور معاونت جهاد در جلسه	۹۸/۱۰/۲	خانم مهندس محمودی جهاد کشاورزی خمین، معاونت جهاد کشاورزی خمین، آقای فرهودی مجری پروژه، تعداد ۱۶ نفر از فعالان اجتماعی شهرستان	کافی شاپ خمین
۴	جلسه با خبرگان و کارآفرینان جوان شهر	رسمی - ارائه مشاوره و تبادل نظر در زمینه ظرفیتهای واقعی منطقه	۹۸/۱۰/۲	آقای محمدی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه مهدیه، آقای روشنی عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مهدیه، تعداد ۲۸ نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی خمین، ۳ نفر از خیریه های مختلف خمین	صندوق مهدیه شهرستان
۵	جلسه با آقای محمدی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه مهدیه	رسمی - در خصوص تبیین مدل و توافقات اولیه برای همراهی صندوق جهت تخصیص اعتبار تسهیلاتی	۹۸/۱۰/۲	آقای محمدی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه مهدیه و آقای فرهودی و دو نفر از هیات مدیره صندوق مهدیه	صندوق مهدیه شهرستان
۶	جلسه با مدیر دفتر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید کشور	رسمی - در خصوص همکاری در اجرای پروژه در خمین و جلب نظر اولیه و ارائه پروپوزال تسهیلاتی به مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور	۹۸/۱۰/۱۱	خانم مهندس کشاورز - آقای فرهودی	صندوق کارآفرینی امید کشور
۷	جلسه با بخشدار قورچه باشی	رسمی - در جهت تبادل نظر و جلب حمایت دهیاران برای اجرای پروژه در روستاها	۹۸/۱۰/۲۵	آقای مهندس اسدی و آقای فرهودی	بخشدار قورچه باشی
۸	جلسه با معاونت توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی	رسمی - در جهت همراهی و اختصاص اعتبارات سامانه کارا برای پروژه خمین	۹۸/۱۰/۲۰	آقای مهندس عمید - آقای فرهودی	اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی
۹	جلسه با مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور	رسمی - در جهت حمایت و عقد تفاهم نامه اعطای تسهیلات بدون ضامن به صندوق ها و اولویت قرار دادن اعضای صندوق در اعطای تسهیلات توسعه کسب و کار	۹۸/۱۱/۰۲	آقای دکتر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، آقای مهندس مومنی مدیرعامل موسسه خیریه نعیم، آقای فرهودی مجری طرح، خانم کشاورز مدیرتوانمندسازی صندوق کارآفرینی امید و خانم دکتر سپهری مدیر آموزش زاگرس	صندوق کارآفرینی امید کشور
۱۰	جلسه با مدیریت صندوق کارآفرینی امید	رسمی - در جهت تبادل نظر و بررسی تفاهم نامه فی مابین	۹۸/۱۱/۳۰	آقای دکتر هزاوه ی مدیر صندوق استان، کارشناسان ستادی صندوق، آقای مهندس مومنی مدیر موسسه خیریه نعیم و آقای فرهودی مجری طرح	صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی
۱۱	جلسه با جهاد کشاورزی	رسمی اداری - در خصوص معرفی رابطین	۹۸/۱۲/۱۳	آقای مهندس واعظی، خانم مهندس محمودی و آقای فرهودی	اداره جهاد کشاورزی شهرستان خمین
۱۲	جلسه با مدیریت صندوق کارآفرینی امید خمین	رسمی - در خصوص تفاهم نامه و مدل همکاری	۹۹/۰۱/۱۸	آقای نوروزی مدیر صندوق و آقای فرهودی	صندوق کارآفرینی امید خمین

ردیف	عنوان جلسه	نوع جلسه	تاریخ	حاضرین	محل جلسه
۱۳	جلسه با تسهیلاتگران طرح	رسمی - در خصوص پیگیری ورود به محلات و روستاها	۹۹/۰۱/۲۷	۷ تسهیلاتگر محلی، خانم محمودی کارشناس مشاور طرح و خانم دکتر نوشادی تسهیلاتگر ارشد و آقای فرهودی	دفتر زاگرس در خمین
۱۴	جلسه با تسهیلاتگران طرح	رسمی - در خصوص نحوه ورود به روستاها و محلات بعد از کرونا	۹۹/۰۲/۱۴	۷ تسهیلاتگر محلی، خانم محمودی کارشناس مشاور طرح و خانم دکتر نوشادی تسهیلاتگر ارشد و آقای فرهودی	هتل امام رضا خمین
۱۵	جلسه با صندوق کارآفرینی امید کشور	رسمی - در خصوص پیگیری مشکلات تفاهم نامه و هماهنگی با واحد حقوقی	۹۹/۰۱/۲۳	خانم کشاورز و آقای فرهودی	صندوق کارآفرینی امید کشور
۱۶	جلسه با تسهیلاتگران طرح	رسمی - پیگیری تشکیل صندوق در روستاهای چهارچشمه و سرکوبه و محلات محسن آباد، شهرک مهر و احمدآباد	۹۹/۲/۲۲	۷ تسهیلاتگر محلی، خانم محمودی و آقای فرهودی	دفتر زاگرس در خمین
۱۷	جلسه با صندوق امید خمین	رسمی - پیگیری روند بانک پذیری صندوق ها و تسهیل روند	۹۹/۲/۲۳	آقای نوروزی، آقای فرهودی	صندوق امید خمین
۱۸	جلسه با صندوق کارآفرینی امید کشور	رسمی - تهیه دستورالعمل صندوق های محلی	۹۹/۳/۱۲	خانم کشاورز، خانم حسینی، آقای فرهودی	دفتر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید
۱۹	جلسه عقد تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید	رسمی - عقد تفاهم نامه	۹۹/۳/۲۰	خانم کشاورز، آقای مومنی، آقای فرهودی، خانم حسینی	دفتر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید
۲۰	جلسه با تسهیلاتگران	رسمی - در حاشیه دوره آموزش ارکان در خصوص برنامه های بانک پذیری و ثبت اطلاعات صندوق ها در پلتفرم	۹۹/۴/۲	۶ تسهیلاتگر محلی، تسهیلاتگر شهرستان، تسهیلاتگر ارشد و آقای فرهودی	هتل امام رضا
۲۱	جلسه با بسیج سازندگی کشور سردار زهرایی	رسمی - در خصوص اختصاص فضاهای بلااستفاده بسیج در شهرستان برای کارگاههای تولیدی	۹۹/۴/۷	خانم کشاورز، آقای فرهودی، آقای میرقاسمی (همکار زاگرس)، آقای زهرایی (تیم ایشان)	ستاد مرکزی فرماندهی بسیج سازندگی کشور
۲۲	جلسه با صندوق کارآفرینی امید خمین	رسمی - رفع نواقص پرونده ی صندوق ها	۹۹/۰۴/۳۱	آقای نوروزی، آقای فرهودی	صندوق کارآفرینی امید خمین
۲۳	جلسه با صندوق کارآفرینی امید کشور	رسمی - دریافت تاییدیه صندوق حضرت رسول خمین	۹۹/۰۵/۰۴	خانم کشاورز - آقای فرهودی	صندوق کارآفرینی امید کشور
۲۴	جلسه با آموزش پرورش خمین	غیر رسمی - در خصوص تغییر متن اجاره مدرسه خمین	۹۹/۰۵/۰۸	آقای محمدی (حقوقی آموزش و پرورش) - آقای فرهودی	آموزش و پرورش خمین
۲۵	جلسه با چند کارآفرین خمین	غیر رسمی - در خصوص آموزشهای صنایع دستی به اعضا	۹۹/۰۵/۰۸	آقای بیات (کارآفرین) - آقای رضایی (کارآفرین) - آقای فرهودی	دفتر زاگرس در خمین
۲۶	جلسه با آموزش فنی و حرفه ای خمین	رسمی - در خصوص عقد تفاهم نامه همکاری	۹۹/۰۵/۰۹	آقای نصیری (ریاست)، آقای خرمند (معاون آموزشی) - آقای فرهودی	اداره فنی و حرفه ای خمین
۲۷	جلسه با صندوق کارآفرینی امید خمین	رسمی - در خصوص روند پس اندازها و نواقص پرونده ها و گروههای جدید	تا ۱۰ شهریور	آقای نوروزی - خانم محمودی - خانم نوشادی (تعداد ۷ جلسه)	صندوق کارآفرینی امید خمین
۲۸	جلسات هفتگی با تسهیلاتگران	غیر رسمی - بررسی روند پس اندازها	تا ۱۰ شهریور	۷ تسهیلاتگر محلی - تسهیلاتگر ارشد و تسهیلاتگر شهرستانی	دفتر زاگرس در خمین
۲۹	جلسه با صندوق امید خمین	رسمی - بررسی پرونده ها (۵)	تا ۱۴ آبان	آقای نوروزی، خانم محمودی - تسهیلاتگران	صندوق امید خمین
۳۰	جلسه با نماینده آقای نظری (نماینده مجلس)	غیر رسمی - بررسی زمین	۱۱ مهرماه	آقای باقری - آقای فرهودی	دفتر نماینده مجلس
۳۱	جلسه با آموزش و پرورش	رسمی - بررسی زمین	۶ جلسه	آقایان بیرحمن لو، فرهودی، محمدی (حقوقی) و استان	اداره خمین و استان
۳۲	جلسه با تسهیلاتگران	رسمی - بررسی پیشرفت	۴ جلسه	۷ تسهیلاتگر و آقای فرهودی و خانمها نوشادی و محمودی	دفتر زاگرس در خمین
۳۳	جلسه با دهیاران فریق و کفسان	رسمی - بازدید از روستا	۲۹ مهر و ۳ آبان	دهیاران و آقای فرهودی	محل دهیاری ها
۳۴	جلسه با دهیار و آباد و سکانه	رسمی - بررسی روند صندوق	۲۱ مهر و ۲۴ آبان	دهیار و آباد و روستای سکانه	محل دهیاری
۳۵	جلسه با خانم مهندس کشاورز	رسمی - بررسی روند تسهیلات	۱۹ و ۲۵ آبان	خانم مهندس کشاورز، خانم مهندس حسینی و آقای فرهودی	صندوق کارآفرینی امید
۳۶	بازدید و جلسه با مدیرکل کار استان	رسمی - بازدید - در خصوص مجتمع	۱۸ آبان	آقای دکتر آبایی (مدیرکل و هیات همراه)	خمین - دفتر زاگرس
۳۷	جلسه با صندوق کارآفرینی امید خمین	رسمی - در خصوص روند تسهیلات	۱۷ و ۲۷ آبان	آقای مهندس نوروزی، خانم محمودی، آقای فرهودی	صندوق کارآفرینی امید خمین

ردیف	عنوان جلسه	نوع جلسه	تاریخ	حاضرین	محل جلسه
۳۸	نحوه تکمیل پرونده وام	رسمی	۹۹/۱۰/۱	آقای نوروزی - آقای فرهودی	صندوق امید خمین
۳۹	حذف موانع پرداخت وام کارا	رسمی	۹۹/۱۰/۱۴	خانم کشاورز - آقای فرهودی - خانم نوشادی	صندوق امید کشور
۴۰	روشهای ثبت و ضبط وام ها	رسمی	۹۹/۱۰/۱۵	آقای فرهودی - آقای نوروزی - ارکان صندوق ها	صندوق امید خمین
۴۱	بررسی موضوعی پرونده های وام	رسمی	۹۹/۱۰/۱۸	آقای نوروزی - آقای فرهودی	صندوق امید خمین
۴۲	فعالان صنایع دستی خمین	غیر رسمی	۹۹/۱۱/۲	آقای فرهودی و جمعی از فعالان صنایع دستی خمین	شرکت زاگرس در خمین
۴۳	روند تشکیل پرونده وام	رسمی	۹۹/۱۱/۱۳	آقای فرهودی و ۸ تسهیلمگر زاگرس در خمین	دفتر شرکت زاگرس در خمین
۴۴	تصویب شیوه نامه جدید شهری	رسمی	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	آقای فرهودی و خانم کشاورز و تیم صندوق در خصوص شیوه نامه جدید صندوق های شهری	صندوق امید کشور
۴۵	بررسی وام صندوق های جدید	رسمی	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	آقای فرهودی و آقای نوروزی	صندوق امید خمین
۴۶	جلسه شورای اشتغال شهرستان	رسمی	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	آقای مومنی، آقای فرهودی، فرماندار شهرستان و مدیران ادارات	فرمانداری شهرستان خمین
۴۷	بررسی اقدامات بازسازی	غیر رسمی	۶ بازدید در طول مدت ۴ ماه	آقای فرهودی، آقای مومنی (۲ بازدید) و پیمانکار خمین	ساختمان جدید مجتمع
۴۸	بازدید از کسب و کارهای ایجاد شده	غیر رسمی	۸ بازدید	روستاهای آشنا خور، رضا آباد، محلات خمین - آقای فرهودی، خانم محمودی - خانم طهماسبیان	-
۴۹	تسهیل روند پرداخت تسهیلات و تنظیم صورتجلسات وام صندوق ها	رسمی	۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸	آقای نوروزی - آقای فرهودی - تعدادی از تسهیلمگران	صندوق امید
۵۰	جلسه پایش اقدامات	غیر رسمی	۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱	آقای فرهودی - تمامی تسهیلمگران	دفتر زاگرس
۵۱	افتتاحیه مجتمع	رسمی	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	مجری - نعیم - مسئولین شهرستانی - تسهیلمگران - شهروندان - اعضای صندوقها - کارآفرینان شهرستان	مجتمع خدمات کسب و کار نعیم
۵۲	جلسه صندوق شهرستانی	رسمی	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	آقای فرهودی - تمامی سرگروه های صندوق ها و تسهیلمگران	مجتمع
۵۳	جلسه با مدیرعامل صندوق امید کشور	رسمی	آبان ۱۴۰۱	آقای مومنی، آقای فرهودی، آقای دکتر رضایی	دفتر مدیرعامل
۵۴	جلسه با معاونت توسعه کسب و کار صندوق	رسمی	۷ جلسه در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	آقای دکتر یوسفیان، همکاران دفتر صندوق امید، شرکت زاگرس	صندوق امید کشور
۵۵	جلسه با بخشدار، اداره کار، دانشکده پزشکی و اداره کار استان	رسمی	۴ جلسه در ۱۴۰۲	مدیرعامل زاگرس، روسای دستگاهها و همکاران	مجتمع خمین

فعالیت های پروژه

درصد انجام شده تا ۷ آذرماه ۱۴۰۲	وزن عملیاتی	زمان بندی	شرح فعالیت آتی	نوع فعالیت
۴٪	۴٪	سال اول پروژه	ورود به منطقه ، مطالعه و انتخاب مناطق هدف	تشکیل صندوق
۲٪	۲٪		شناسایی و انتخاب تسهیلاتگران	
۳٪	۳٪		آموزش تسهیلاتگران	
۱۰٪	۱۰٪		شناسایی اعضای صندوق ها (جامعه محلی)	
۱۰٪	۱۰٪		تشکیل صندوق ها	
۵٪	۵٪		آموزش ارکان	
۴٪	۴٪		افتتاح حساب صندوق ها در بانک عامل	
۴٪	۴٪		تشکیل جلسات ماهیانه (حداقل ۴ ماه قبل از تسهیلات)	
۵٪	۵٪		پیگیری تامین اعتبار در بانک عامل و ثبت کارا	
۵٪	۳٪		آموزش تربیت مربی کارآفرینی (سه دوره آموزشی)	
۹٪	۹٪	سال دوم پروژه	آموزش اعضای صندوق ها (سه دوره آموزشی)	دریافت تسهیلات
۶٪	۶٪		پرداخت تسهیلات از بانک عامل برای صندوق های خرد	
۵٪	۵٪		ارائه خدمات مشاوره کسب و کار	ایجاد کسب و کارها
۸٪	۱۰٪		بازدید و مانیتورینگ کسب و کارها	
۵٪	۵٪		آموزش های رشد کسب و کار به ارکان (شامل دوره های بازاریابی-فروش- تجاری سازی - حقوقی و برند سازی	
۵٪	۵٪	سال سوم پروژه	طراحی خوشه کسب و کار (یک خوشه صنایع تبدیلی)	توسعه و تکمیل کسب و کارها
۵٪	۵٪		ایجاد برند در منطقه (یک برند در روستای رضاآباد)	
۵٪	۵٪		تسهیل ایجاد زنجیره تامین (یک زنجیره گیاهان دارویی و زعفران)	
۹۸٪	۱۰۰٪	جمع		

جدول تشکیل صندوق های همتای نعیم خمین تا تاریخ ارائه گزارش

تعداد جلسات ماهیانه برگزار شده	تعداد اشتغال	میزان پس انداز هر نفر در سال ۱۴۰۲ (ریال)	میزان موجودی صندوق ها با احتساب وام های دست اعضاء	میزان بدهی صندوق ها به بانک از محل وام اول (ریال)	میزان بازپرداخت تسهیلات به صندوق امید (ریال)	مبلغ گردش حساب صندوق ها و وام های دست اعضاء (ریال)	مبلغ پس انداز اعضا (ریال)	مبلغ موجودی صندوق بدون احتساب گردش تسهیلات (ریال)	مجموع وام های پرداختی (ریال)	میزان وام های فردی پرداخت شده به اعضا از طرف بانک(ریال)	مبلغ تسهیلات توسعه (ریال)	مبلغ تسهیلات اولیه (ریال)	تاریخ دریافت تسهیلات	تاریخ ایجاد صندوق	نام رئیس صندوق	نام مربی کارآفرینی	نام تسهیلاتگر	تعداد اعضا	وضعیت	موقعیت مکانی	نام صندوق	ردیف
۳۶	۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	پریسا حیدری	پریسا حیدری	خانم صمدی	۲۵	فعال	شهری	صندوق دارالاکرام	۱
۳۳	۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	زهرا مجیدی	زهرا مجیدی	خانم طهماسبیان	۲۵	فعال	شهری	صندوق حضرت رسول	۲
۳۰	۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	مریم بهمنی	پروین حسینی کیا	خانم طهماسبیان	۲۶	فعال	روستایی	صندوق آسناخور	۳
۳۳	۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	پریا شمسی	اعظم شمسی	خانم امیدی	۲۵	فعال	شهری	صندوق کارجویان	۴
۳۴	۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	آزاده رستمی	آزاده رستمی	خانم امیدی	۲۲	فعال	شهری	صندوق کارورزان	۵
۳۲	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	الهام براتی	الهام براتی	خانم براتی	۲۵	فعال	شهری	صندوق دارالاکرام ۲	۶
۳۴	۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	مهديه مرتاضی	خانم مرتاضی	خانم مرتاضی	۲۴	فعال	روستایی	صندوق سرکوبه	۷
۳۰	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	مهناز مددی	خورشید بیات	خانم بیات	۲۷	فعال	روستایی	صندوق چهارچشمه	۸
۳۷	۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	مریم حامدی	لیلا اعتمادی	خانم صمدی	۲۵	فعال	شهری	صندوق احمد اباد	۹
۳۶	۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	محدثه ارشادی	فاطمه هاشمی	خانم طهماسبیان	۲۸	فعال	روستایی	صندوق حسین آباد-رضا آباد	۱۰
۳۶	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	اشرف شریفی	اشرف شریفی	خانم صمدی	۲۵	فعال	شهری	صندوق همتای پویا (فجر)	۱۱
۲۸	۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	لیلا عیسیوندی	مریم صمدی	خانم صمدی	۲۵	فعال	شهری	صندوق فنی و حرفه ای	۱۲
																	خانم طهماسبیان		حذف	شهری	صندوق رسول اکرم	۱۳
																	خانم اسحاقی		حذف	روستایی	صندوق سکانه	۱۴
																	خانم درویش پور		حذف	روستایی	صندوق میشیجان سفلی	۱۵
																	خانم مردانی		حذف	روستایی	صندوق وراآباد	۱۶
																	خانم مردانی		حذف	روستایی	صندوق شهابیه	۱۷
																	خانم طهماسبیان		حذف	روستایی	صندوق فریق	۱۸
																	خانم طهماسبیان		حذف	شهری	صندوق حضرت رسول	۱۹
																	خانم طهماسبیان		حذف	روستایی	صندوق کفسان	۲۰
																	خانم صمدی		حذف	شهری	صندوق صنایع دستی ۲	۲۱
۳۹۹	۳۷۵		۴۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰						۳۰۲		جمع آماری تا تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۲		

مشکلات و ریسک های دوره گزارش دهی

مشکلات:

- موازی کاری نهادهای خصولتی در تشکیل صندوق های محلی
- موانع بدنه کارشناسی صندوق کارآفرینی امید در سطح استان با مفاد تفاهم نامه فی مابین (برطرف گردید)
- بی اعتمادی جامعه محلی به اجرای برنامه توان افزایی در محلات و روستاها بدلیل عدم کارایی مدل های اجرا شده در گذشته (برطرف گردید)
- بدلیل وجود خیریه ها و نهادهای حامی متنوع در شهرستان انگیزه فعالیت اقتصادی جامعه آسیب دیده و در معرض آسیب کم رنگ می باشد.
- محدودیت های خاص تجمعات در ماه رمضان به دلیل کرونا (رفع شد)
- توان مالی پایین جامعه هدف برای پس انداز های محدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی ماهیانه
- جابجایی اعضای صندوق ها (تثبیت شد)
- جابجایی مدیریت صندوق کارآفرینی امید استان و عدم اطلاع از روند اجرای برنامه (از طریق مدیر صندوق کارآفرینی امید خمین مذاکرات انجام شده و در جریان پروژه قرار گرفتند)
- عدم تامین مکان برگزاری جلسات ماهیانه توسط مساجد و مدارس محل به دلیل کرونا و محدودیت های ناشی از ان (برطرف گردید و مکان جلسه و آموزشی جدیدی اجاره شد)
- حذف دو صندوق به دلیل عدم توافق اعضا برای ادامه کار (دو روستای جدید جایگزین شدند)
- شیوه نامه جدید صندوق کارآفرینی و الزام به ثبت دفترخانه ی اسناد تسهیلات (برطرف گردید)
- تشدید اپیدمی کرونا در منطقه و ممانعت از ورود تسهیلات به محلات و روستا به دلیل قرنطینه (جدید)
- تغییر هیات مدیره و ارکان صندوق خرد محلی کارورزان و انتخاب ارکان جدید (جدید - روند اعتبارسنجی را کند نمود)
- حذف چند صندوق با بیش از ۵ ماه از تشکیل
- ثبت اطلاعات تسهیلات در سامانه صندوق امید که بسیار سخت و زمان بر بود
- حذف ۳ صندوق قدیمی در مرحله پرداخت تسهیلات به دلیل عدم توافق اعضا
- سایت تارا جهت درج اطلاعات صندوق ها در طول ۴ ماه گذشته که به صورت متناوب مشکلاتی را ایجاد کرد
- طولانی شدن مدت تایید وام ها در ستاد تهران

ریسک ها:

- عدم پذیرش جامعه محلی برای ایجاد صندوق (هر چند در مرحله شناسایی و ورود به روستا موافقت اولیه حاصل شده است)
- آرمان گرایی کاذب نهادهای دولتی و غیر دولتی خمین در جهت توسعه شهرستان، امکان آسیب جدی به پروژه خرد با رویکرد تامین مالی خرد میتواند وارد نماید.
- تشدید کرونا در منطقه و عدم تامین مکان برگزاری جلسات
- ورود بسیج سازندگی به روستاها جهت ایجاد صندوق های صرفا مالی بدلیل تسهیلات با مبلغ بالای این نهاد
- شیوع فاز سوم شیوع کرونا در روستاها و شهر خمین و امکان عدم برگزاری جلسات حضوری
- شیوع فاز چهارم و پنجم کرونا در روستاها و شهر خمین و امکان عدم برگزاری جلسات حضوری

میزان پیشرفت پروژه

ردیف	نام فاز	درصد پیشرفت پروژه	
		باید انجام می شد	انجام شده
۱	کل عملیاتی اجرایی پروژه	۱۰۰٪	۹۸٪

اطلاعات اکولوژیکی روستاها و محلات پیش بینی شده برای ایجاد صندوق

چهارچشمه قلعه حیدر



نام تسهیلگر: **خورشید بیات**

نام بخش: **کمره**

نام دهستان: **چهارچشمه (شامل ۴ قلعه که یکی از قلعه ها حیدر نام دارد)**

فاصله تا مرکز شهرستان: **۴۵ کیلومتر**

جمعیت: **۴۰ خانوار**

توزیع سن و جنس: **میانگین سنی در روستا ۳۷ سال و نسبت زنان به مردان ۵۵ درصد**

تعداد جمعیت مهاجر: **از سایر استانها ۲ خانوار**

عمده آسیب های اجتماعی در روستا: **بیکاری جوانان عمدتا در زنان**

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در روستا (کم، زیاد، متوسط): **متوسط**

متوسط درآمد خانوارها: **زیر ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال**

عمده کسب و کار زنان روستایی: **دامداری، تولیدی لبنیات**

میزان سواد عمومی روستا: **میانگین سواد عمومی در روستا راهنمایی**

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): **بالا**

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): **انسجام خانواده ای**

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در روستا: **دهیاری، پایگاه بسیج، شبکه بهداشت و یک مدرسه**

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در روستا: **پارک کودک، مسجد جامع و عباسیه، سالن ورزشی**

وضعیت عمومی اشتغال در روستا: **عمدتا شاغل فصلی می باشند، دامداری و کشاورزی**

منابع و فرصت های موجود در روستا: **دامداری و کشاورزی**

طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در روستا قبل از پروژه صندوق همتا: -

سطح مشارکت جامعه روستایی در طرح های توسعه ای قبلی: -

افراد تاثیر گذار در روستا: **دهیار و شورای روستا**

دلایل انتخاب این روستا: **علاقتمندی جامعه محلی برای همکاری در پروژه ها و بیکاری زیاد بخصوص زنان در روستا**

روستای سرکوبه



نام تسهیلگر: **مرضیه مرتاضی**

نام بخش: **مرکزی**

نام دهستان: **حمزه لو**

فاصله تا مرکز شهرستان: **۲۰ کیلومتر**

جمعیت: **۹۲ خانوار**

توزیع سن و جنس: **میانگین سنی در روستا ۳۲ سال و نسبت زنان به مردان ۴۸ درصد**

تعداد جمعیت مهاجر: **از سایر استانها ۳ خانوار**

عمده آسیب های اجتماعی در روستا: **بیکاری جوانان عمدتاً در زنان و اعتیاد**

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در روستا (کم، زیاد، متوسط): **کم**

متوسط درآمد خانوارها: **زیر ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال**

عمده کسب و کار زنان روستایی: **دامداری، تولیدی لبنیات و صنایع دستی و بسته بندی حبوبات**

میزان سواد عمومی روستا: **میانگین سواد عمومی در روستا دیپلم**

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): **متوسط**

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): **انسجام خانواده ای**

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در روستا: **پایگاه بسیج، شبکه بهداشت و یک مدرسه و دهیار**

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در روستا: **مسجد جامع و حسینیه، پارک کودک**

وضعیت عمومی اشتغال در روستا: **عمدتاً شاغل فصلی می باشند، دامداری و کشاورزی**

منابع و فرصت های موجود در روستا: **دامداری و کشاورزی، گردشگری و زیارتی، رودخانه**

طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در روستا قبل از پروژه صندوق همتا: -

سطح مشارکت جامعه روستایی در طرح های توسعه ای قبلی: -

افراد تاثیر گذار در روستا: **مدیر مدرسه، دهیار و رئیس پایگاه بسیج**

دلایل انتخاب این روستا: **علاقتمندی جامعه محلی برای همکاری در پروژه ها و بیکاری زیاد بخصوص زنان در روستا**



روستای آشناخور

نام تسهیلگر: **طاهره طهماسیان**

نام بخش: **کمره**

نام دهستان: **خرم دشت**

فاصله تا مرکز شهرستان: **۱۰۲ کیلومتر**

جمعیت: **۱۸۰ خانوار**

توزیع سن و جنس: **میانگین سنی در روستا ۴۶ سال و نسبت زنان به مردان ۴۸ درصد**

تعداد جمعیت مهاجر: **از سایر استانها ۴ خانوار**

عمده آسیب های اجتماعی در روستا: **بیکاری جوانان عمدتاً در زنان و طلاق**

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در روستا (کم، زیاد، متوسط): **متوسط**

متوسط درآمد خانوارها: **زیر ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال**

عمده کسب و کار زنان روستایی: **کشاورزی، تولیدی لبنیات و صنایع دستی**

میزان سواد عمومی روستا: **میانگین سواد عمومی در روستا راهنمایی**

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): **متوسط**

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): **انسجام خانواده ای**

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در روستا: **پایگاه بسیج، شبکه بهداشت و یک مدرسه و دهیاری**

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در روستا: **مسجد جامع و پارک کودک**

وضعیت عمومی اشتغال در روستا: **عمدتاً شاغل فصلی می باشند، دامداری و کشاورزی**

منابع و فرصت های موجود در روستا: **دامداری و کشاورزی، زیارتی و گردشگری**

طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در روستا قبل از پروژه صندوق همتا: **بنیاد برکت**

سطح مشارکت جامعه روستایی در طرح های توسعه ای قبلی: **متوسط**

افراد تاثیر گذار در روستا: **دهیار و رئیس پایگاه بسیج**

دلایل انتخاب این روستا: **علاقمندی جامعه محلی برای همکاری در پروژه ها و وجود آسیب های اجتماعی و بیکاری**

زیاد بخصوص زنان در روستا و مهاجرت روستاییان به شهرها

روستای حسین آباد آشناخور



نام تسهیلگر: طاهره طهماسیان

نام بخش: مرکزی

نام دهستان: آشنا خور

فاصله تا مرکز شهرستان: ۳۰ کیلومتر

جمعیت: ۵۵ خانوار

توزیع سن و جنس: میانگین سنی در روستا ۳۸ سال و نسبت زنان به مردان ۴۵ درصد

تعداد جمعیت مهاجر: از سایر استانها ۵ خانوار

عمده آسیب های اجتماعی در روستا: بیکاری جوانان عمدتاً در زنان و اعتیاد

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در روستا (کم، زیاد، متوسط): زیاد

متوسط درآمد خانوارها: زیر ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

عمده کسب و کار زنان روستایی: کشاورزی، تولیدی لبنیات

میزان سواد عمومی روستا: میانگین سواد عمومی در روستا راهنمایی

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): متوسط

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): انسجام خانواری

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در روستا: پایگاه بسیج، شبکه بهداشت و یک مدرسه و دهیاری

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در روستا: مسجد و پارک کودک

وضعیت عمومی اشتغال در روستا: عمدتاً شاغل فصلی می باشند، دامداری و کشاورزی

منابع و فرصت های موجود در روستا: دامداری و کشاورزی


طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در روستا قبل از پروژه صندوق همتا: صندوق سپاه

سطح مشارکت جامعه روستایی در طرح های توسعه ای قبلی: بالا

افراد تاثیر گذار در روستا: دهیار

دلایل انتخاب این روستا: علاقمندی جامعه محلی برای همکاری در پروژه ها و وجود آسیب های اجتماعی و بیکاری

زیاد بخصوص زنان در روستا و مهاجرت روستاییان به شهرها

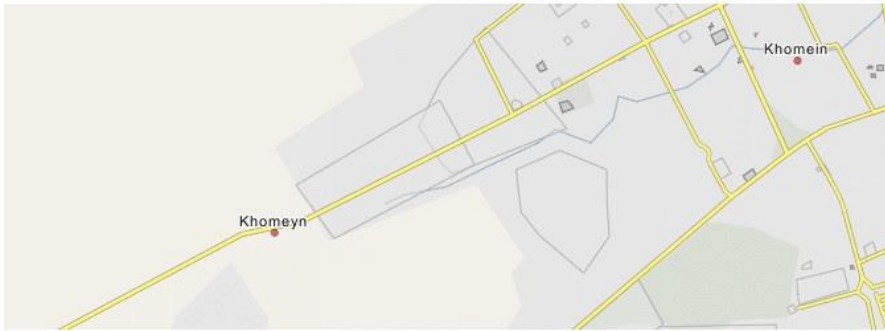

محله فیروزآباد

نام تسهیلگر: **سمیه مردانی**

موقعیت جغرافیایی محله: **حومه شهر**

خیابان منتهی به محله: **دانشجو**

جمعیت: **بالغ بر ۲۱۰۰ خانوار**

توزیع سن و جنس: **میانگین سنی در محله ۲۷ سال و نسبت زنان به مردان ۵۳ درصد**

جمعیت مهاجر: **بافت یکنواخت ندارد و اکثراً مهاجر هستند**

عمده آسیب های اجتماعی در محله: **بیکاری جوانان عمدتاً در زنان ، شدیداً اعتیاد ، طلاق و بزهکاری**

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در محله (کم، زیاد، متوسط): **متوسط**

متوسط درآمد خانوارها: **زیر ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال**

عمده کسب و کار زنان محلی: **پاک کردن حبوبات، صنایع دستی، خیاطی و مشاغل غیر مولد**

میزان سواد عمومی محلی: **دییلم**

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): **کم**

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): **گسسته**

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در محله: **پایگاه بسیج، شبکه بهداشت و دو مدرسه**

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در محله: **مسجد و پارک کودک ، پارک بانوان ، کتابخانه**

وضعیت عمومی اشتغال در محله: **مردها عمدتاً کارگر در سایر شهرها، زنها عمدتاً کارگر خدماتی و یا کم مزد**

منابع و فرصت های موجود در محله: **همکاری نهادها در بازآفرینی شهری محلی، به دلیل نزدیکی به روستای ریحان**

در زمینه فرآوری محصولات لبنی فرصت مناسبی وجود دارد، اکثر بانوان علاقمند به فعالیت برای تامین معیشت هستند

طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در محله قبل از پروژه صندوق همتا: **بازآفرینی شهری و عمرانی**

سطح مشارکت جامعه محلی در طرح های توسعه ای قبلی: **متوسط**

افراد تاثیر گذار در محله: **هیات امنای مسجد و کسبه معتبر محله**

دلایل انتخاب این محله: **فقر قابلیتی شدید در محله، بیکاری ، آسیب های اجتماعی ، عدم دسترسی به منابع مالی**

محله شهرک مهر (معلم)

نام تسهیلگر: **فاطمه امیدی**

موقعیت جغرافیایی محله: **حومه شهر**

خیابان منتهی به محله: **کمربندی امام خمینی و بنیاد**

جمعیت: **بالغ بر ۱۸۰۰ خانوار**

توزیع سن و جنس: **میانگین سنی در محله ۲۹ سال و نسبت زنان به مردان ۵۵ درصد**

جمعیت مهاجر: **بافت یکنواخت ندارد و اکثراً مهاجر هستند**

عمده آسیب های اجتماعی در محله: **بیکاری جوانان عمدتاً در زنان، فقر، اعتیاد، طلاق و بزهکاری**

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در محله (کم، زیاد، متوسط): **زیاد**

متوسط درآمد خانوارها: **زیر ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال**

عمده کسب و کار زنان محلی: **پاک کردن حبوبات، صنایع دستی، خیاطی و مشاغل غیر مولد**

میزان سواد عمومی محلی: **فوق دیپلم**

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): **متوسط**

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): **انسجام خانواده ای**

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در محله: **پایگاه بسیج، شبکه بهداشت و ۴ مدرسه**

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در محله: **مسجد و پارک کودک، پارک، کتابخانه**

وضعیت عمومی اشتغال در محله: **مردها عمدتاً کارگر، زنها عمدتاً کارگر خدماتی و یا کم مزد و صنایع دستی**

منابع و فرصت های موجود در محله: **همکاری نهادها در بازآفرینی شهری محلی، به دلیل حاشیه شهر بودن و جمعیت**

بالای ساکن در محله هر گونه فعالیت اقتصادی در محله می تواند فرصت مناسبی را ایجاد نماید. اکثر بانوان علاقمند

به فعالیت برای تامین معیشت هستند

طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در محله قبل از پروژه صندوق همتا: **اصلاح بافت سنتی و آپارتمان سازی از**

بابت پروژه مسکن مهر در محله

سطح مشارکت جامعه محلی در طرح های توسعه ای قبلی: **متوسط**

افراد تاثیر گذار در محله: **پایگاه بسیج و شبکه بهداشت**

دلایل انتخاب این محله: **فقر قابلیتی شدید در محله، بیکاری، آسیب های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع مالی**

محله صدوقی

نام تسهیلگر: **فاطمه امیدی**

موقعیت جغرافیایی محله: **حومه**

خیابان منتهی به محله: **بلوار صدوقی، خیابان رسالت، خیابان فنی و حرفه ای**

جمعیت: **بالغ بر ۱۳۵۰ خانوار**

توزیع سن و جنس: **میانگین سنی در محله ۳۳ سال و نسبت زنان به مردان ۵۱ درصد**

جمعیت مهاجر: **بافت یکنواخت ندارد و اکثراً مهاجر هستند**

عمده آسیب های اجتماعی در محله: **بیکاری جوانان عمدتاً در زنان، فقر، اعتیاد، طلاق**

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در محله (کم، زیاد، متوسط): **متوسط**

متوسط درآمد خانوارها: **زیر ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال**

عمده کسب و کار زنان محلی: **صنایع دستی، خیاطی، آرایشگری و مشاغل غیر مولد**

میزان سواد عمومی محلی: **دپلم**

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): **زیاد**

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): **انسجام خانواده ای**

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در محله: **پایگاه بسیج، شبکه بهداشت و ۳ مدرسه**

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در محله: **مسجد و پارک بانوان، پارک کودک**

وضعیت عمومی اشتغال در محله: **مردها عمدتاً کارگر، زنها عمدتاً کارگر خدماتی و یا کم مزد و صنایع دستی**

منابع و فرصت های موجود در محله: **همکاری نهادها در بازآفرینی شهری محلی، به دلیل حاشیه شهر بودن و جمعیت**

بالای ساکن در محله هر گونه فعالیت اقتصادی در محله می تواند فرصت مناسبی را ایجاد نماید. اکثر بانوان علاقمند

به فعالیت برای تامین معیشت هستند

طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در محله قبل از پروژه صندوق همتا: -

سطح مشارکت جامعه محلی در طرح های توسعه ای قبلی: -

افراد تاثیر گذار در محله: **هیات امنای مسجد و زنان روضه خوان**

دلایل انتخاب این محله: **فقر قابلیتی شدید در محله، بیکاری، آسیب های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع مالی**

محله احمدآباد



نام تسهیلگر: **مریم صمدی**

موقعیت جغرافیایی محله: **حومه**

خیابان منتهی به محله: **بلوار دانشجو، بلوار طالقانی**

جمعیت: **بالغ بر ۱۱۰۰ خانوار**

توزیع سن و جنس: **میانگین سنی در محله ۳۷ سال و نسبت زنان به مردان ۵۳ درصد**

جمعیت مهاجر: **بافت یکنواخت ندارد و اکثراً مهاجر هستند**

عمده آسیب های اجتماعی در محله: **بیکاری جوانان عمدتاً در زنان، فقر، اعتیاد، طلاق و بزهکاری**

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در محله (کم، زیاد، متوسط): **زیاد**

متوسط درآمد خانوارها: **زیر ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال**

عمده کسب و کار زنان محلی: **صنایع دستی، خیاطی، آرایشگری و مشاغل غیر مولد**

میزان سواد عمومی محلی: **سیکل**

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): **زیاد**

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): **گسسته**

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در محله: **پایگاه بسیج، پایگاه سلامت، شبکه بهداشت و ۲ مدرسه**

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در محله: **مسجد، بوستان**

وضعیت عمومی اشتغال در محله: **مردها عمدتاً کارگر، زنها عمدتاً کارگر خدماتی و یا کم مزد و صنایع دستی**

منابع و فرصت های موجود در محله: **همکاری نهادها در بازآفرینی شهری محلی، به دلیل حاشیه شهر بودن و جمعیت**

بالای ساکن در محله هر گونه فعالیت اقتصادی در محله می تواند فرصت مناسبی را ایجاد نماید. اکثر بانوان علاقمند

به فعالیت برای تامین معیشت هستند


طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در محله قبل از پروژه صندوق همتا: **ایجاد پایگاه سلامت اجتماعی**

سطح مشارکت جامعه محلی در طرح های توسعه ای قبلی: **متوسط**

افراد تاثیر گذار در محله: **مدیران مدارس**

دلایل انتخاب این محله: **فقر قابلیتی شدید در محله، بیکاری، آسیب های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع مالی**

محله محسن آباد

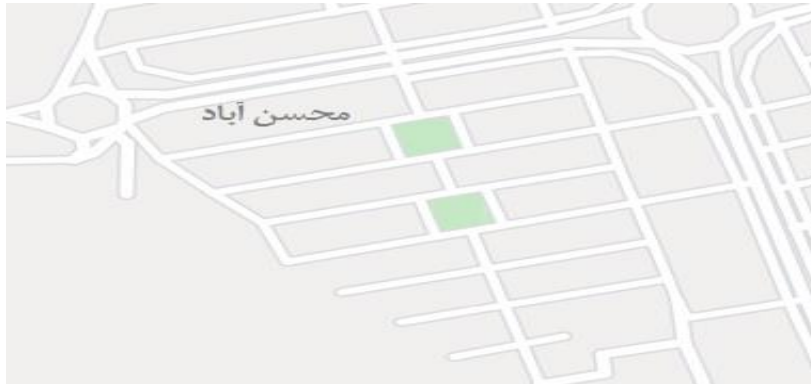

نام تسهیلگر: **مریم صمدی**

موقعیت جغرافیایی محله: **حومه**

خیابان منتهی به محله: **خیابان رسالت، بلوار مطهری، بلوار امام خمینی**

جمعیت: **بالغ بر ۱۴۰۰ خانوار**

توزیع سن و جنس: **میانگین سنی در محله ۳۲ سال و نسبت زنان به مردان ۴۸ درصد**

جمعیت مهاجر: **بافت یکنواخت دارد کمتر مهاجر پذیر است**

عمده آسیب های اجتماعی در محله: **بیکاری جوانان عمدتاً در زنان، فقر، اعتیاد، طلاق**

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در محله (کم، زیاد، متوسط): **زیاد**

متوسط درآمد خانوارها: **زیر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال**

عمده کسب و کار زنان محلی: **صنایع دستی، خیاطی، مشاغل بسته بندی**

میزان سواد عمومی محلی: **سیکل**

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): **زیاد**

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): **انسجام خانواده ای**

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در محله: **پایگاه بسیج، کلینیک مددکاری، درمانگاه و ۳ مدرسه**

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در محله: **مسجد، بوستان**

وضعیت عمومی اشتغال در محله: **مردها عمدتاً شغل آزاد، زنها عمدتاً کارگر خدماتی و یا کم مزد و صنایع دستی**

منابع و فرصت های موجود در محله: **همکاری نهادها در بازآفرینی شهری محلی، به دلیل حاشیه شهر بودن و جمعیت**

بالای ساکن در محله هر گونه فعالیت اقتصادی در محله می تواند فرصت مناسبی را ایجاد نماید. اکثر بانوان علاقمند

به فعالیت برای تامین معیشت هستند

طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در محله قبل از پروژه صندوق همتا: **ایجاد کلینیک مددکاری اجتماعی**

سطح مشارکت جامعه محلی در طرح های توسعه ای قبلی: **خوب**

افراد تاثیر گذار در محله: **هیات امنای مساجد**

دلایل انتخاب این محله: **فقر قابلیتی شدید در محله، بیکاری، آسیب های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع مالی**

محله شاهین



نام تسهیلگر: **طاهره طهماسبیان**

موقعیت جغرافیایی محله: **حومه**

خیابان منتهی به محله: **بلوار امام خمینی ، بلوار دانشجو، بلوار گردان امام**

جمعیت: **بالغ بر ۹۰۰ خانوار**

توزیع سن و جنس: **میانگین سنی در محله ۳۶ سال و نسبت زنان به مردان ۵۱ درصد**

جمعیت مهاجر: **بافت یکنواخت دارد**

عمده آسیب های اجتماعی در محله: **بیکاری جوانان عمدتاً در زنان ، فقر ، اعتیاد ، طلاق و بزهکاری**

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در محله (کم، زیاد، متوسط): **متوسط**

متوسط درآمد خانوارها: **زیر ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال**

عمده کسب و کار زنان محلی: **صنایع دستی، خیاطی، مشاغل بسته بندی**

میزان سواد عمومی محلی: **سیکل**

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): **متوسط**

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): **گسسته**

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در محله: **پایگاه بسیج و ۲ مدرسه و چند خیریه**

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در محله: **مسجد ، سالن ورزشی**

وضعیت عمومی اشتغال در محله: **مردها عمدتاً شغل آزاد یا کارگر ، زنها عمدتاً کارگر خدماتی و یا کم مزد و صنایع**

دستی

منابع و فرصت های موجود در محله: **همکاری نهادها در بازآفرینی شهری محلی، به دلیل حاشیه شهر بودن و جمعیت**

بالای ساکن در محله هر گونه فعالیت اقتصادی در محله می تواند فرصت مناسبی را ایجاد نماید. اکثر بانوان علاقمند

به فعالیت برای تامین معیشت هستند


طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در محله قبل از پروژه صندوق همتا: **سالن ورزشی**

سطح مشارکت جامعه محلی در طرح های توسعه ای قبلی: **خوب**

افراد تاثیر گذار در محله: **مدیران مدارس**

دلایل انتخاب این محله: **فقر قابلیتی شدید در محله، بیکاری ، آسیب های اجتماعی ، عدم دسترسی به منابع مالی**

محله قیام

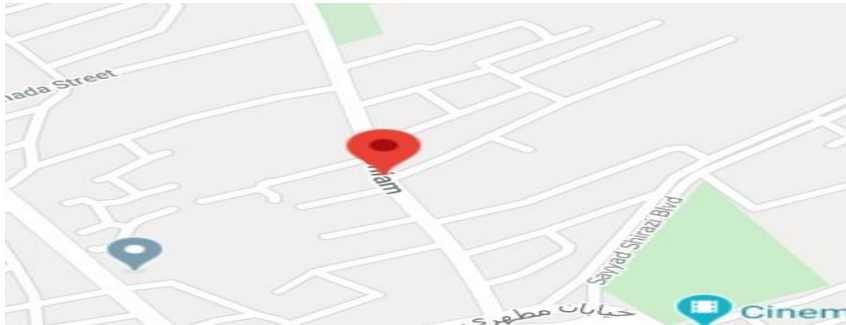

نام تسهیلگر: **طاهره طهماسبیان**

موقعیت جغرافیایی محله: **حومه**

خیابان منتهی به محله: **خیابان مطهری، بلوار شیرازی**

جمعیت: **بالغ بر ۱۰۰۰ خانوار**

توزیع سن و جنس: **میانگین سنی در محله ۳۶ سال و نسبت زنان به مردان ۵۴ درصد**

جمعیت مهاجر: **بافت یکنواخت ندارد اکثر مهاجر هستند**

عمده آسیب های اجتماعی در محله: **بیکاری جوانان عمدتاً در زنان، فقر، اعتیاد، طلاق و بزهکاری**

وضعیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در محله (کم، زیاد، متوسط): **زیاد**

متوسط درآمد خانوارها: **زیر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال**

عمده کسب و کار زنان محلی: **صنایع دستی، خیاطی، مشاغل غیر مولد**

میزان سواد عمومی محلی: **سیکل**

نوع ارتباط همسایگان با همدیگر (سرمایه اجتماعی): **زیاد**

نوع روابط خانوادگی (گسسته & انسجام خانواری & انسجام خانواده ای): **انسجام خانواده ای**

نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقر در محله: **پایگاه بسیج و ۴ مدرسه و خیریه آل طاهر**

امکانات رفاهی و تفریحی موجود در محله: **مسجد، سالن ورزشی**

وضعیت عمومی اشتغال در محله: **مردها عمدتاً کارگر، زنها عمدتاً کارگر خدماتی و یا کم مزد و صنایع دستی**

منابع و فرصت های موجود در محله: **همکاری نهادها در بازآفرینی شهری محلی، به دلیل حاشیه شهر بودن و جمعیت**

بالای ساکن در محله هر گونه فعالیت اقتصادی در محله می تواند فرصت مناسبی را ایجاد نماید. اکثر بانوان علاقمند

به فعالیت برای تامین معیشت هستند

طرحهای عمرانی و اجتماعی اجرا شده در محله قبل از پروژه صندوق همتا: -

سطح مشارکت جامعه محلی در طرح های توسعه ای قبلی: -

افراد تاثیر گذار در محله: **موسسه خیریه آل طاهر**

دلایل انتخاب این محله: **فقر قابلیتی شدید در محله، بیکاری، آسیب های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع مالی**

جدول تاخیرات کلیدی پروژه

ردیف	عنوان تاخیر	علت تاخیر	پیامدهای ناشی از تاخیر
۱	تاخیر در عقد تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید	موارد اصلاحی مد نظر صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی	تاخیر در پرداخت تسهیلات (انجام شد)
۲	تاخیر در تشکیل صندوق	بدلیل اپیدمی کرونا	تشکیل تعدادی از صندوق ها از اواسط اردیبهشت ماه ۹۹ انجام خواهد شد (انجام شد)
۳	تاخیر در انجام فعالیتهای پژوهشی بدلیل عدم امکان مطالعات میدانی	بدلیل کرونا	تاخیر در مستند سازی پژوهشی (انجام شد)
۴	تاخیر در تشکیل ۵ صندوق باقیمانده	بدلیل ریزش و جذب دوباره اعضا	تاخیر در افتتاح حساب (انجام شد)
۵	تاخیر در تشکیل ۲ صندوق باقیمانده	دلیل تغییر ارکان	تاخیر در افتتاح حساب
۶	تاخیر در اعتبار سنجی	بدلیل عدم ارسال شیوه نامه از تهران	تاخیر در پرداخت تسهیلات
۷	تاخیر در جایگزینی دو صندوق جدید	بدلیل کرونا	تاخیر در افتتاح حساب
۸	تاخیر در تایید وام ها در وزارت رفاه	بسته بودن سایت کارا	تاخیر در پرداخت تسهیلات

تغییرات کلی پروژه

عنوان تغییر	جذب ۸ صندوق در زمان پرداخت تسهیلات باعث شد که صندوق های جدیدی وارد پروژه شوند	تاریخ تایید اعمال تغییر	سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰
مبدأ درخواست تغییر	شرکت زاگرس	سمت در پروژه	مجری
شرح تغییر	با توجه حذف هشت صندوق و تاخیر در پرداخت تسهیلات تکمیلی		
دلایل ایجاد تغییر	مشکلات ناشی از همه گیری کرونا و محدودیت منابع بانکی		
تاثیر تغییر بر محدوده پروژه	تاثیر زیادی نخواهد داشت. سعی خواهد سرعت بیشتری به پروژه داده شود.		
تاثیر تغییر بر هزینه های پروژه	ندارد		
تاثیر تغییر بر زمان بندی پروژه	به میزان ۳۰ روز تاخیر خواهد داشت.		

گزارش تصویری پروژه

نمونه فرم افتتاح حساب صندوق های خرد محلی و روستایی در صندوق کارآفرینی امید

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
ساعت: ۱۱:۱۶ ق.ظ
صفحه: ۱ از ۱

کد: ۴۴۱۸

شماره سبده: ۴۴۱۸,۷۷۹,۲۲۲۱۷۴,۱

عنوان سبده: سبده مشترک قرض الحسنه پس انداز - صندوق خرد محلی روستای آشناخور - مریم بهمنی

نوع گردش: همه گردش ها
تاریخ گردش از: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

ردیف	تاریخ سند	شماره سند	بند	شرح بند سند	مبلغ گردش	بده/بسی	مانده
۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۵۰۹۳۸	۳۰۱۰۴۴۸	۲	التماس سبده	۸,۰۹۰,۰۰۰	بسی	۸,۰۹۰,۰۰۰
جمع گردش ها:					۸,۰۹۰,۰۰۰		

تایید کننده: [مهر و امضا]
تصویب کننده: [مهر و امضا]
کد گزارش: [مهر و امضا]

عقد تفاهم نامه فی مابین با صندوق کارآفرینی امید



نمونه تصاویر جلسات با تسهیلات در خصوص روند پیشرفت پروژه



جلسه هم اندیشی با فعالان اجتماعی و اقتصادی شهرستان خمین - قبل از شروع پروژه در خمین



برگزاری دوره آموزش ارکان صندوق ها








بازدید ارکان صندوق از مرکز در حال تجهیز کسب و کار خانگی خمین



برگزاری جلسات ماهیانه اعضای صندوق های مالی خرد محلی و روستایی

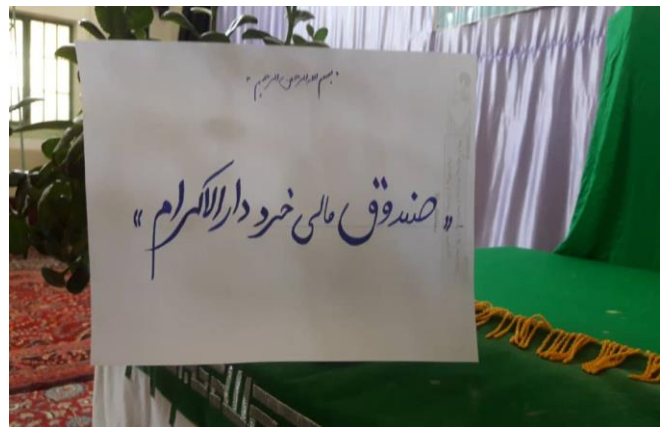

جلسات مشترک با صندوق کارآفرینی امید شهرستان خمین



بازدید مجری طرح از صندوق های تشکیل شده در خمین و مشاوره و ارزیابی فردی توانمندیهای اعضا



بازدید مجری طرح از صندوق های تشکیل شده در خمین و مشاوره و ارزیابی فردی توانمندیهای اعضا



بازدید مجری طرح از صندوق های تشکیل شده در خمین و مشاوره و ارزیابی فردی توانمندیهای اعضا




بازدید مجری طرح از صندوق های تشکیل شده در خمین و مشاوره و ارزیابی فردی توانمندیهای اعضا



برگزاری دوره اول تربیت مربی کارآفرینی در خمین



برگزاری دوره اول آموزش مهارت‌های زندگی و خلق ایده در خمین برای اعضای صندوق‌ها

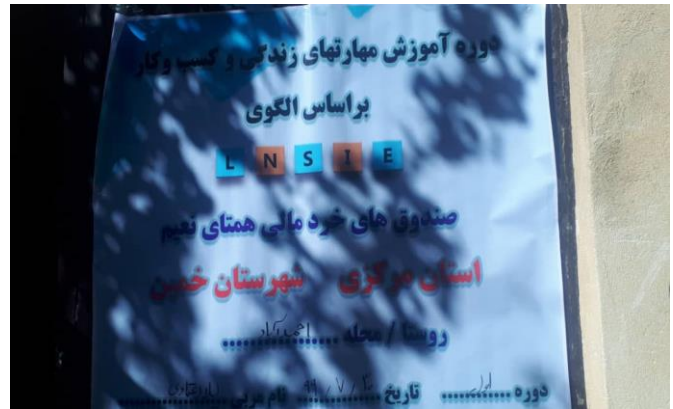

برگزاری دوره اول آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی و خلق ایده در خمین - اعضای صندوق ها



برگزاری دوره اول آموزش مهارت‌های زندگی شغلی و خلق ایده در خمین و اعتبار سنجی صندوق‌ها توسط مدیریت

صندوق کارآفرینی امید شهرستان خمین - اعضای صندوق‌ها



برگزاری دوره دوم تربیت مربی کارآفرینی در خمین



نمونه تصاویر برگزاری دوره دوم آموزش مهارت ایجاد کسب و کار و تدوین بوم کسب و کار - اعضای صندوق ها





تصاویر دوره آموزش روانشناسی رنگ و تولید انواع مدل های گلیم سه بعدی



**دوره آموزش روانشناسی رنگ در صنایع دستی
و مصنوعات تولیدی از گلیم
و تولید گلیم های سه بعدی**


**ویژه اعضای صندوق های خرد مالی
همتای نعیم**

تعداد حرفه آموزان: ۳۰ نفر

مربی دوره:

**خانم خدیجه سعیدپور
کارآفرین برتر صنایع دستی کشور از استان
آذربایجان غربی**

۱۵-۱۶-۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۹

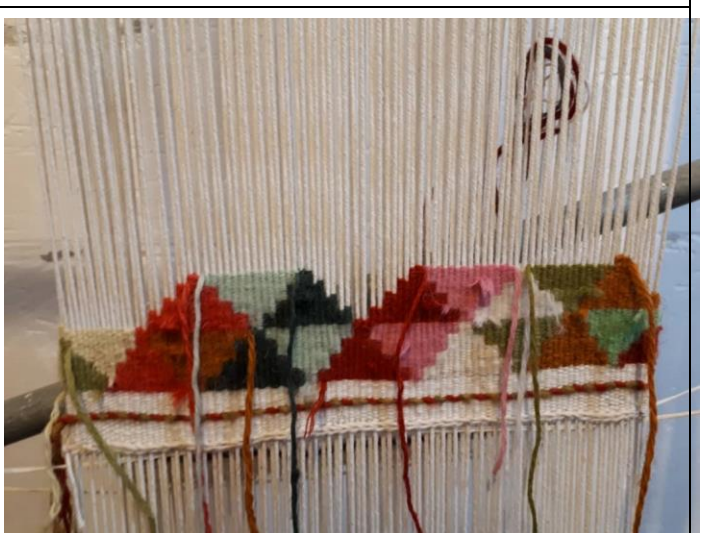

تصاویر از روند پیشرفت بازسازی مجتمع خدمات کسب و کار نعیم در شهرستان خمین



تاریخ شروع بازسازی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ پیش بینی اتمام کار بازسازی: ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

مبلغ اعتبار پیش بینی شده برای بازسازی و تجهیز مجتمع: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مبلغ هزینه شده تا تاریخ گزارش: ۱۷۰ میلیون تومان

نمونه کسب و کارهای ایجاد شده اعضای صندوق های خرد محلی و روستایی نعیم خمین



صندوق دارالکرام - خانم برات پور - کارگاه خیاطی



صندوق دارالکرام - خانم اصغری - کارگاه خیاطی



صندوق دارالکرام - خانم حیدری - کارگاه پوشاک کودک



صندوق دارالکرام - خانم ها حسنی و شنوایی - آرایشگاه



صندوق دارالکرام - خانم ها امیری و یوسفی - کارگاه دستچین لوبیا



صندوق دارالکرام - خانم حیدری - کارگاه نانوائی شیری

نمونه کسب و کارهای ایجاد شده اعضای صندوق های خرد محلی و روستایی نعیم خمین



صندوق دارالکرام - خواهران دهقان - فروشگاه لباس



صندوق دارالکرام - خانم عبدی - پرورش مرغ بومی



صندوق کارجویان - خانم برات زاده - کارگاه دستچین لوبیا



صندوق دارالکرام - خانم گلی - کارگاه خیاطی



صندوق کارجویان - خانم خانجانی - کارگاه فرش



صندوق کارجویان - خانم برات زاده - کارگاه خانوادگی دستچین لوبیا

نمونه کسب و کارهای ایجاد شده اعضای صندوق های خرد محلی و روستایی نعیم خمین



صندوق کارجویان - خانم براتی - کارگاه خیاطی




صندوق کارجویان - خانم حبیبی - فروشگاه مواد غذایی



صندوق کارورزان - خانم جوادزاده - آموزشگاه نقاشی



صندوق کارجویان - آقای شمس - کارگاه نجاری

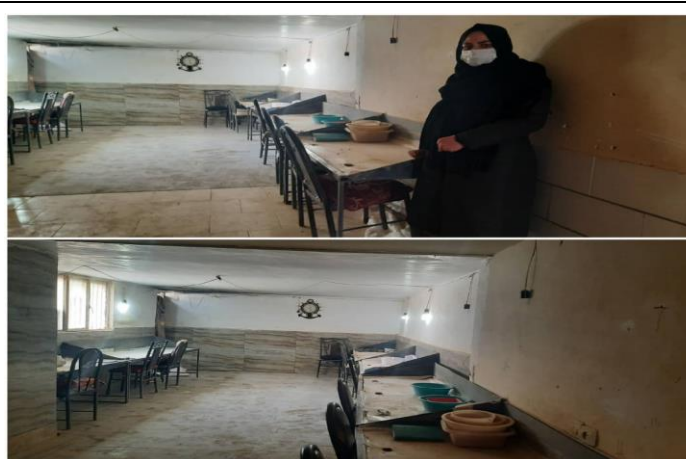

صندوق کارورزان - خانم خانجانی - کارگاه دستچین لوبیا



صندوق کارورزان - خانم خانجانی - کارگاه خیاطی

نمونه کسب و کارهای ایجاد شده اعضای صندوق های خرد محلی و روستایی نعیم خمین



صندوق کارورزان - خانم رضایی - گلخانه



صندوق کارورزان - خانم رستمی - فروشگاه لباس



صندوق کارورزان - خانم لطفی - حسابداری در منزل



صندوق کارورزان - خانمها بیات زاده و عبدالهی - آموزش دوره ماسک



صندوق روستای آشناخور - خانم آژ - دامپروری



صندوق کارورزان - خانم مظاهری - کارگاه پتینه و میناکاری

نمونه کسب و کارهای ایجاد شده اعضای صندوق های خرد محلی و روستایی نعیم خمین



صندوق روستای آشناخور - خانم برفی پور - کارگاه خانوادگی خیاطی



صندوق روستای آشناخور - خانم آژ - کارگاه فرشینه



صندوق روستای آشناخور - خانم بی بی محمدی - دامپروری



صندوق روستای آشناخور - خانم بهمنی - دامپروری



صندوق روستای آشناخور - خانم بهمنی - فرشینه



صندوق روستای آشناخور - خانم پایمرد - تولید لباس محلی بختیاری

نمونه کسب و کارهای ایجاد شده اعضای صندوق های خرد محلی و روستایی نعیم خمین



خانم آخوندی- وام ۶ میلیون تومان - آرایشگری- صندوق دارالاکرام



خانم زمانی- وام ۶ میلیون تومان - فروشگاه لباس- دارالاکرام



خانم صفری- وام ۶ میلیون تومان- خیاطی- صندوق دارالاکرام



خانم رضایی - وام ۵ میلیون تومان- قالی بافی- صندوق دارالاکرام



خانم اعتمادی- وام ۸ میلیون تومان-فروشگاه پوشاک - صندوق احمدآباد



خانم علی پور- وام ۶ میلیون تومان- عرق گیری- صندوق پویا

نمونه کسب و کارهای ایجاد شده اعضای صندوق های خرد محلی و روستایی نعیم خمین



خانم امیری- وام ۸ میلیون تومان- دستچین لوبیا- احمدآباد



خانم مرادی- وام ۶ میلیون تومان- هنرهای تزئینی- احمدآباد



خانم برات پور- وام ۶ میلیون تومان- خیاطی- احمدآباد



خانم آسترکی- وام ۸ میلیون تومان- میل شویی- احمدآباد



خانم حامدی- وام ۸ میلیون تومان- فروشگاه لباس- احمدآباد



خانم مومن زاده- وام ۵ میلیون تومان- تزئینات نمدی- احمدآباد

نمونه کسب و کارهای ایجاد شده اعضای صندوق های خرد محلی و روستایی نعیم خمین



خانم شریفی - وام ۷ میلیون تومان - فروشگاه لباس کودک - پویا



خانم حامدی - وام ۱۰ میلیون تومان - فروشگاه لباس کودک - احمدآباد



خانم بیات - وام ۶ میلیون تومان - قالی بافی - پویا



خانم عبدی - وام ۸ میلیون تومان - خیاطی - پویا



خانم گلی - وام ۱۰ میلیون تومان - کارگاه خیاطی - دارالاکرام



خانم فرجی - وام ۱۰ میلیون تومان - پرورش دام - دارالاکرام

نمونه کسب و کارهای ایجاد شده اعضای صندوق های خرد محلی و روستایی نعیم خمین



خانم مرتاضی - وام ۱۰ میلیون تومان - سوپرمارکت - روستای سرکوبه



خانم حیدری - وام ۱۰ میلیون تومان - پرورش دام - دارلاکرام



خانم کریمی - وام ۱۰ میلیون تومان - خرید گوساله - سرکوبه



خانم افشاری - وام ۱۰ میلیون تومان - پرورش ماهی - خانوادگی - سرکوبه



آقای سرلک - وام ۱۰ میلیون تومان - توسعه گلخانه - کاورزان



خانم سادات - وام ۸ میلیون تومان - پرورش دام - سرکوبه

نمونه کسب و کارهای ایجاد شده اعضای صندوق های خرد محلی و روستایی نعیم خمین



آقای علی خانجانی - ۱۰ میلیون تومان - فروشگاه پوشاک - کارورزان



خانم خانجانی - وام ۱۰ میلیون تومان - دستچین لوبیا - کارورزان



خانم رضانی - وام ۸ میلیون تومان - روغن گیری دارویی - پویا



خانم محبتی - وام ۸ میلیون تومان - پرورش پرند زینتی - کارورزان



آقای گلخندان - وام ۱۰ میلیون تومان - پرورش ماهی زینتی - کارورزان


تصاویر افتتاحیه مجتمع خدمات کسب و کار، شتابدهی و کافه کارآفرینی نعیم در شهرستان خمین



ادامه تصاویر افتتاحیه مجتمع خدمات کسب و کار، شتابدهی و کافه کارآفرینی نعیم در شهرستان خمین



تصاویر مانیتورینگ کسب و کارهای ایجاد شده در شهرستان خمین توسط تیم مجری

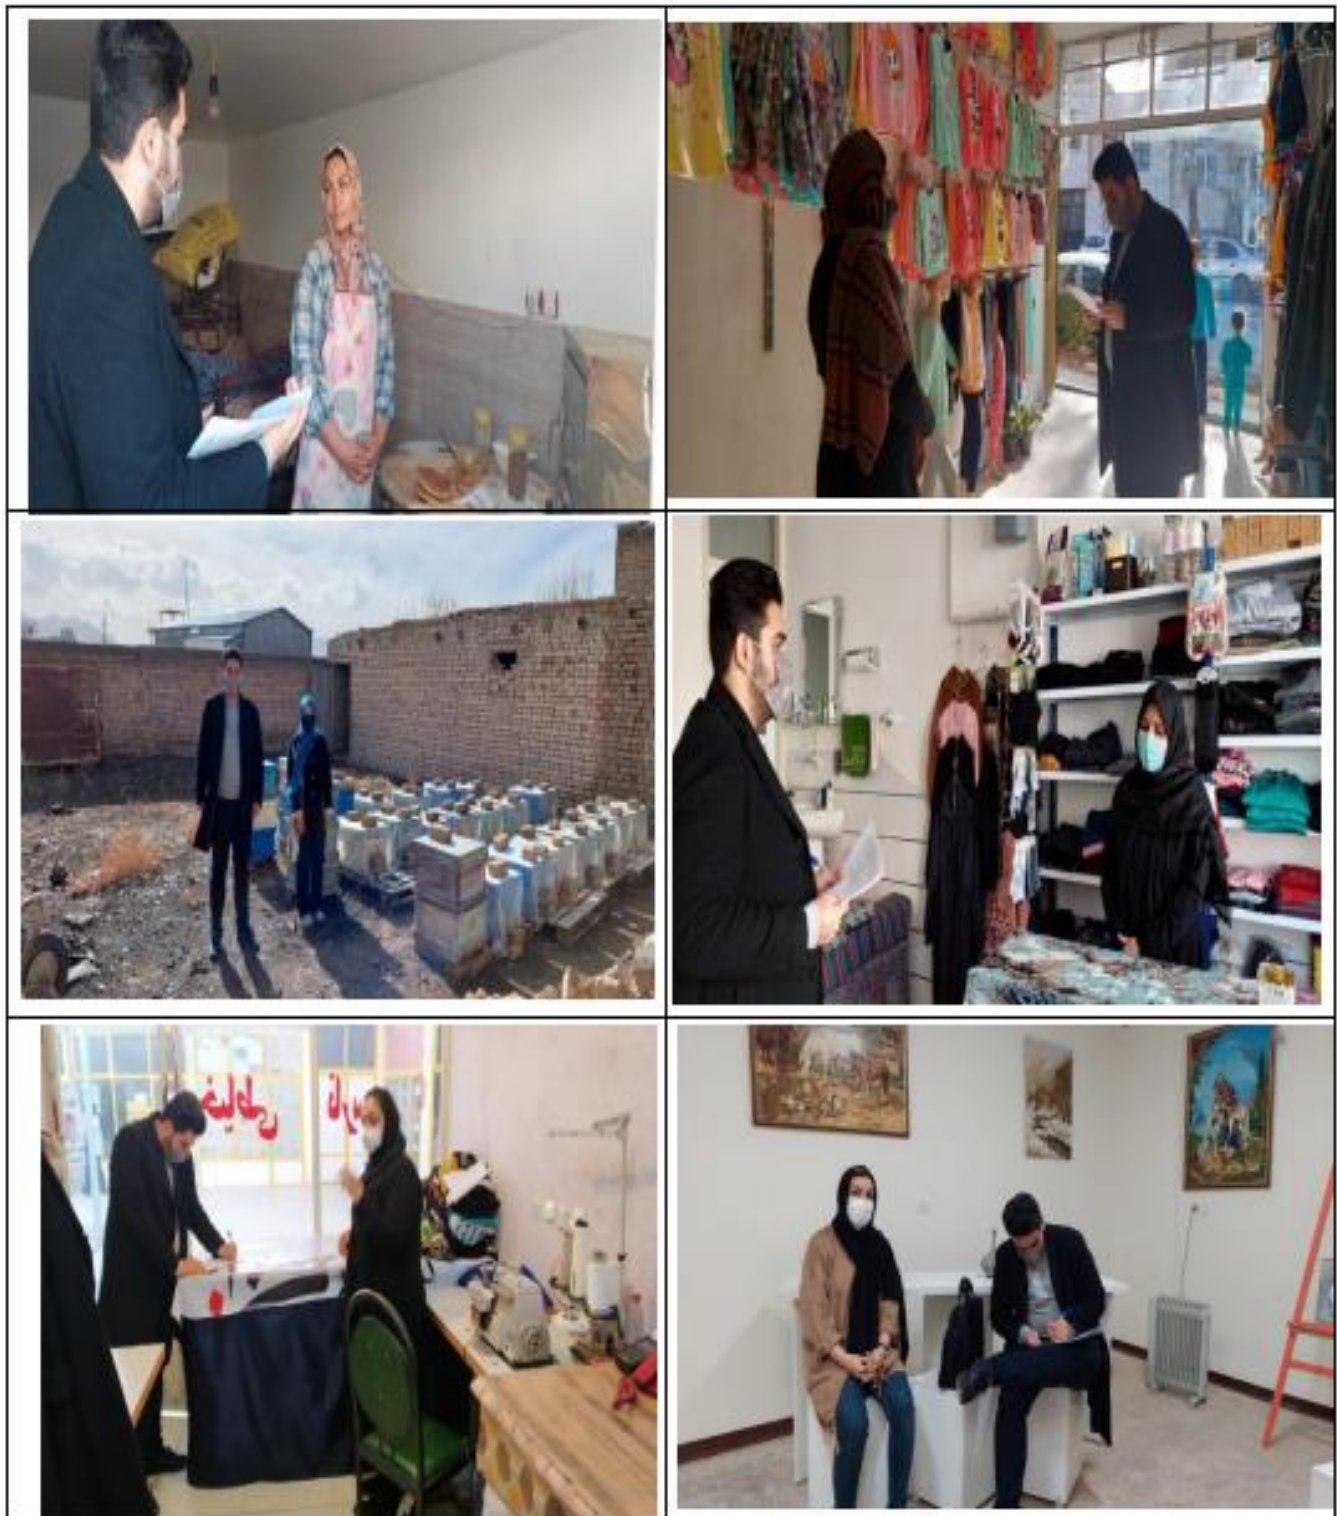

ادامه تصاویر مانیتورینگ کسب و کارهای ایجاد شده در شهرستان خمین توسط تیم مجری



ادامه تصاویر مانیتورینگ کسب و کارهای ایجاد شده در شهرستان خمین توسط تیم مجری



تصاویر دوره سوم تربیت مربی کارآفرینی - مربی خانم امیدی



تصاویر دوره آموزش برندسازی و طراحی مد در پوشاک - مربی خانم حدیث ناصریان



تصاویر دوره آموزش مصنوعات چرمی - مربی خانم نیلوفر نوریان



تصاویر دوره آموزش بازاریابی و فروش در فضای مجازی - مربی آقای علیرضا فلکدین



برگزاری سه دوره ۲۴ ساعته مهارت‌های زندگی شغلی و مهارت‌های کسب و کار (گام های اول تا سوم LNSIE)



جلسه با آقای دکتر رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور و بررسی صندوق های مالی خرد روستایی و شهری خمین

