

گزارش چهارم پیشرفت پروژه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

پروژه:

اجرای توان افزایی جامعه محلی با رویکرد ایجاد ۴۵ صندوق مالی خرد، هدایت، حمایت و پشتیبانی برای ایجاد و توسعه و پایداری کسب و کارهای

خرد با الگوی LNSIE در شهرستان آبادان

کار مشترک موسسه خیریه نعیم، بنیاد خیریه هاسب و شرکت کارآفرینی زاگرس و

صندوق کارآفرینی امید



۱۴۰۲/۱۲/۱۲

فهرست مطالب

۳	مقدمه.....
۴	گزارش توصیفی اجرای پروژه.....
۵	جدول همکاران پروژه و تسهیلگران
۶	جلسات مهم برگزار شده در راستای پروژه.....
۷	فعالیت های قبلی انجام شده در پروژه...../.....
۷	فعالیت های جدید انجام شده در پروژه...../.....
۸	فعالیت های آتی پیش بینی شده در پروژه.....
۹	مشکلات و ریسک های دوره گزارش دهی
۱۰	میزان پیشرفت پروژه.....
۱۰	جدول تاخیرات کلیدی پروژه.....
۱۱	تغییرات کلی پروژه
۱۲	تصاویر اجرای پروژه

مقدمه:

افزایش قابلیت‌های بشر و بسط انتخاب‌های مردم، هدف توسعه است. توانمندی علاوه بر ارزش ذاتی، ارزش ابزاری نیز دارد. پیوند بین توانمندسازی و پیامدهای توسعه‌ی به ویژه فقرزدایی وجود دارد که انگیزه‌های قوی برای توسعه و پیشبرد توانمندسازی در مداخله‌ها را فراهم می‌کند. در واقع، رشد توانمندی افراد، محرک توسعه است.

در سال‌های اخیر، طرح‌های متعددی در ایران برای توانمندسازی و فقرزدایی اجرا شده است. یکی از طرح‌ها، طرح صندوق‌های مالی خرد محلی است

برنامه تامین مالی خرد، یکی از تدابیر مطرح برای رشد توانمندی افراد مطرح شده است. صندوق‌های خرد محلی، راهبردی توسعه‌ای است که در سراسر جهان برای تحقق توسعه اجتماعی اقتصادی گسترش یافته است. پارادایم زیربنا و محرک برنامه‌های صندوق‌های خرد مالی، "پارادایم خودپایداری مالی" است. که در آن ادعا می‌شود خانوارهای فقیر سراسر جهان قادر خواهند شد با دریافت اعتبار از فقر‌رهایی یابند نه با کمک‌های توسعه‌ای...

در حال حاضر، موفقیت برنامه‌های مالی خرد به عنوان عاملی موثر در فقرزدایی شناخته شده است. حامیان این رویکرد از نرخ‌های بازپرداخت بیشتر از ۹۵ درصد، مشارکت فراوان زنان، تحقق بهبود و پیشرفت‌هایی در سلامت و آموزش کودکان و ظرفیت برنامه‌های مذکور برای دستیابی به پایداری مالی در بلندمدت یاد می‌کنند. این رویکرد جدید، ظرفیت موجود در نهادها و قراردادهای نوآورانه‌ی را نشان می‌دهد که میتواند شرایط زندگی جوامع کم‌درآمد را بهبود بخشد.

پایداری، انتخاب خودجوش اعضا (توسط خودشان)، وام‌دهی گروهی، تعهد مشترک و نظارت همتایان، زمان بندی مناسب برای بازپرداخت وام (عمدتاً با تعدد بالا و فواصل کم میان اقساط)، وام‌دهی صعودی (افزایش تدریجی میزان وام) استفاده از جایگزین‌های وثیقه مانند پس انداز و گاهی همراهی برنامه‌های خرد مالی با خدمات اجتماعی اولیه (آموزش، سلامت و بهداشت) و پیگیری اهداف توسعه اجتماعی از ویژگی‌های برنامه‌های اعتبار خرد و تامین مالی خرد است.

این پروژه، با حمایت مالی و معنوی بنیاد خیریه همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان (هاسب)، موسسه خیریه نعیم و مدیریت پروژه توسط شرکت کارآفرینی زاگرس از دیماه ۱۴۰۱، آغاز گردیده است

گزارش توصیفی:

تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲

در پروژه توان افزایشی جامعه محلی با رویکرد ایجاد ۴۰ صندوق مالی خرد، هدایت، حمایت و پشتیبانی برای ایجاد و توسعه و پایداری کسب و کارهای خرد با الگوی LNSIE در شهرستان آبادان از محل حمایت های مالی بنیاد هاسب و ۵ صندوق از محل مسئولیت اجتماعی نعیم و زاگرس، در راستای اهداف اشتغال پیش بینی شده، پس از ایجاد صندوق ها و تامین منابع مالی برای راه اندازی کسب و کارها، دوره های آموزشی و هدایت شغلی اتفاق خواهد افتاد. در زمینه کسب و کار اولویت اصلی توجه به ظرفیتهای شهرستان با توجه به تقاضای بازار می باشد و اولویت های بعدی نیاز بازار شهرستان و استان و حتی ملی مد نظر قرار خواهد گرفت و کسب و کارهای بر محوریت تولید تا عرضه پیاده سازی خواهد شد.

برای رسیدن به اهداف پروژه، طبق پیش بینی های صورت گرفته لزوم تربیت تسهیلمان محلی برای ورود به محلات و روستاهای تعیین شده و تشکیل گروههای همتای نعیم برای ایجاد صندوق ها بسیار اهمیت دارد. بهمین منظور در فاز اول پروژه تیم مدیریت محلی مشخص شدند و تسهیلمان هر روستا نیز شناسایی و با مجری قرارداد همکاری را منعقد نمودند و در فاز دوم آموزش تسهیلمگری محلی و آموزش ایجاد صندوق های خرد مالی همتا به دو صورت مجازی و حضوری انجام گردید.

مطالعات روستاها و مناطق هدف توسط تیم محلی با استفاده از اسناد بالادستی و بازدید های میدانی انجام گردید و مناطق هدف طی دو جلسه حضوری در آبادان و تهران به تایید آقای عساکره ناظر معرفی شده از طرف کارفرما رسیدند. در این مطالعات، ظرفیتهای و پتانسیلهای روستاها و محلات حاشیه شهر، جمعیت، میزان محرومیت و پتانسیل توسعه از شاخص های انتخاب بودند.

تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

در دوماه گذشته جلسات متعددی با فرماندار، معاونت های سرمایه گذاری و اجتماعی، منطقه آزاد، بهزیستی و شیوخ و دهیاران روستاهای مشخص شده توسط تیم مجری برگزار گردید و بخش دولتی در جریان کامل اتفاقات قرار گرفته است. بازدید منطقه ای توسط مدیرعامل شرکت کارآفرینی زاگرس در اسفند ماه ۱۴۰۱ انجام شد و روستاهای مشخص شده و مناطق شهری از بعد شاخص های سلامت اجتماعی، جمعیتی، محرومیت های اجتماعی بررسی و تایید شدند.

پس از تایید اولیه مناطق توسط مجری، نماینده کارفرما و فرمانداری، مجدداً جلسات معرفی طرح در روستاها و مناطق حاشیه شهری با حضور مدیر پروژه از تهران و تیم محلی مجری، در فروردین ماه انجام گردید در طول مدت معرفی طرح به جامعه محلی، مزیت های منطقه ای و پتانسیلهای موجود احصاء، مدل توانمندسازی و ایجاد خوشه ها مشخص و در شورای اشتغال شهرستان مصوب گردیدند. در اردیبهشت ماه نیز با حضور مدیر پروژه آبادان و تیم محلی، مجدداً جلسه ی با منطقه آزادالوند و بهزیستی جهت جذب حداکثری گروههای آسیب دیده در صندوق ها برگزار گردید و سپس با حضور در روستاها و مناطق حاشیه شهری، با حضور اعضای صندوق ها، گروههای تامین مالی خرد تشکیل و جهت معرفی به صندوق کارآفرینی امید شهرستان آبادان، اقدامات لازم انجام گردید.

تا تاریخ گزارش در تمام مناطق مشخص شده سه نفر ارکان مشخص شدند، در ۲۲ روستا صندوق های مالی خرد تشکیل شدند، ۵ روستا در حال تکمیل لیست ۱۵ نفره هستند و در ۱۳ منطقه حاشیه شهری نیز صندوق های مالی خرد تشکیل و در مرحله معرفی به صندوق کارآفرینی امید هستند.

در جلسه با منطقه آزاد الوند نیز مقرر گردید از ظرفیتهای حمایتی آنها در روستاهایی که در بخش الوند هستند استفاده شود شامل تامین مالی زنجیره های ایجاد شده یا خوشه های پیش بینی شده، تامین فضای فروش، تامین لجستیک تیم محلی در منطقه و هر حمایتی که در راستای تسهیل روند پروژه نیاز باشد.

ضمناً معاونت سرمایه گذاری فرمانداری نیز با دریافت رزومه و سوابق مجری طرح، تصمیم دارد جلسه ی با بنیاد برکت و علوی آبادان جهت ایجاد هم افزایی بیشتر هماهنگ نماید.

تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

در طول سه ماه گذشته تعداد ۴۰ صندوق در آبادان تشکیل گردیدند و طی دو نامه جهت افتتاح حساب به صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان معرفی و هر صندوق مبلغ ۲۰ میلیون تومان آورده اولیه خود را که مجموعه ۸۰۰ میلیون تومان می باشد در حساب صندوق خود تامین نموده است.

۵ صندوق جدید در دست ایجاد هستند که مراحل ورود به روستا و جلب حمایت اهالی در حال انجام است.

در این مدت، تفاهم نامه صندوق امید، موسسه نعیم و شرکت زاگرس جهت تامین تسهیلات پروژه آبادان منعقد گردید و ۹ میلیارد تومان اعتبار در اختیار استان خوزستان از بابت پروژه توانمندسازی هاسب قرار گرفت.

این منابع متناسب با پیشرفت پروژه در اختیار صندوق های مالی خرد روستایی و شهری با بهره ۶ درصد قرار خواهد گرفت. جلسات ماهیانه صندوق های ایجاد شده بطور منظم در نواحی روستایی و حاشیه شهری با حضور تسهیلاتگران بر اساس برنامه زمان بندی اعلامی از طرف تسهیلاتگران در اواخر هر ماه برگزار می گردد و اعضا در خصوص اقدامات انجام شده، برنامه ها و اهداف آینده صحبت می کنند و صورتجلسات نیز در سامانه تارا ثبت و ضبط می گردد.

با نظر صندوق امید و موسسه مجری، یکی از شروط معرفی برای دریافت تسهیلات برگزاری ۶ جلسه ماهیانه با حضور ۲/۳ اعضا می باشد.

در مردادماه ۱۴۰۲ مدیرعامل شرکت کارآفرینی زاگرس با حضور در آبادان از تعدادی از صندوق های مالی خرد ایجاد شده بازدید و با اعضای آنها گفتگو نمودند.

همچنین خانم ناصریان مدیر پروژه آبادان، با حضور مرتب در آبادان، اقدامات تسهیلاتگران و روند انجام افتتاحیه حساب ها را از نزدیک رصد و موانع و مشکلاتی که بعضا وجود داشت رفع نمودند.

دوره های آموزشی ارکان صندوق های آبادان بدلیل مصادف شدن با ایام ماه محرم و در طول آن اربعین به پیشنهاد ارکان و تسهیلاتگران به بعد ماه مبارک صفر موکول گردید و برنامه ریزی گردیده است این دوره آموزش دو روزه با حضور ۱۳۰ نفر از ارکان صندوق ها در یکی از سالن های آموزشی آبادان برگزار شود.

تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

در طول یکماه گذشته، سه صندوق جدید در دست برنامه ریزی بودند که با ورود به روستاها و هماهنگی با دهیاران و معتمدین محلی قرار شد از اواخر ماه مهر تسهیلاتگران، نسبت به برگزاری اولین جلسه اقدام نماید.

جلسات ماهیانه صندوق های ایجاد شده بطور منظم در نواحی روستایی و حاشیه شهری با حضور تسهیلاتگران بر اساس برنامه زمان بندی اعلامی از طرف تسهیلاتگران در اواخر هر ماه برگزار می گردد و اعضا در خصوص اقدامات انجام شده، برنامه ها و اهداف آینده صحبت می کنند و صورتجلسات نیز در سامانه تارا ثبت و ضبط می گردد.

دوره های آموزشی ارکان صندوق های آبادان در روزهای ۲۰ و ۲۱ مهرماه با حضور سه نفر از هر صندوق مجموعا به تعداد ۱۴۰ نفر در سالن سینمای آبادان با حضور استاد نوشادی (تسهیلاتگر ارشد پروژه) برگزار خواهد شد.

در این دوره دو روزه ارکان با روشهای مدیریت صندوق، حسابداری و روشهای ضبط و ثبت اصلاحات صندوق آشنا خواهند شد.

تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

در طول دومه گذشته، ۴۴ صندوق در ۳۶ نقطه روستایی و ۹ نقطه محله شهری ایجاد شدند و همه ۴۴ صندوق افتتاح حساب نمودند. تعداد ۲۸ صندوق موجودی ده درصد خود را در صندوق کارآفرینی امید ذخیره کردند و در تاریخ ۲۸ آبانماه ۱۴۰۲ نامه تسهیلات ۲۸ صندوق برای پرداخت به صندوق امید استان خوزستان ارسال گردید و پیگیری های لازم از ستاد مرکزی صندوق جهت تصویب از محل منابع داخلی با نرخ ۴ درصد انجام شد

جلسات ماهیانه صندوق های ایجاد شده بطور منظم در نواحی روستایی و حاشیه شهری با حضور تسهیلمان بر اساس برنامه زمان بندی اعلامی از طرف تسهیلمان در اواخر هر ماه برگزار می گردد و اعضا در خصوص اقدامات انجام شده، برنامه ها و اهداف آینده صحبت می کنند و صورتجلسات نیز در سامانه تارا ثبت و ضبط می گردد.

همچنین دوره تربیت مربی کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار با تدریس خانم دکتر کتایون سپهری در محل سالن VIP سینما کیهان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱ و ۲ آذرماه با حضور ۳۶ نفر از اعضای صندوق ها برگزار گردید. در این دوره فراگیران با روشهای شناسایی ایده و فرصتهای منطقه ای و لزوم اعتبار سنجی ایده ها قبل از دریافت تسهیلات آشنا شدند و مقرر گردید مطالب آموزش دیده را به سایر اعضای صندوق های خود منتقل نمایند.

تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

در طول دومه گذشته، یک صندوق جدید در منطقه ۲۰۰۰ واحدی به پروژه اضافه شد و مجموعاً ۴۵ صندوق مالی خرد در آبادان تشکیل و همه صندوق ها با تامین آورده ۱۰ درصدی خود در صندوق کارآفرینی امید افتتاح حساب نمودند. با توجه به محدودیت های تسهیلاتی موجود در صندوق امید، با رایزنی و برگزاری چند جلسه در بیناد برکت، بنیاد علوی، جهاد کشاورزی بسیج سازندگی، کمیته امداد و صندوق امید کشور و جلب موافقت نهادها برای حمایت از صندوق های مالی خرد ایجاد شده در آبادان، مقرر گردید تعداد ۱۴ صندوق از محل اعتبارات بسیج سازندگی، تعداد ۲۷ صندوق از محل سامانه سینا

وزارت جهاد کشاورزی و ۴ صندوق از محل اعتبارات بنیاد علوی پرداخت شود و نامه پرداخت تسهیلات به ریاست سازمان بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی ارسال و بنیاد علوی نیز بصورت غیر رسمی توافق لازم انجام شده است.

در ادامه دوره سوم تربیت مربی کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار با تدریس دکتر فرهودی در محل سالن VIP سینما کیهان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۴ و ۵ بهمن ماه با حضور ۳۲ نفر از اعضای صندوق ها برگزار گردید. در این دوره فراگیران با روش‌های خلق مدل کسب و کار، بازاریابی و فروش قبل از دریافت تسهیلات آشنا شدند و مقرر گردید مطالب آموزش دیده را به سایر اعضای صندوق های خود منتقل نمایند.

تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

در طول یکماه گذشته، سه صندوق از محل اعتبارات بنیادعلوی تامین مالی شدند و ۱۱ صندوق نیز در بانک سینا اقدام به تشکیل پرونده تسهیلات نمودند.

۵ صندوق روستایی که تمام اعضا آنها زنان روستایی بودند نیز از محل تبصره ۱۸ سامانه سیتای وزارت جهاد کشاورزی، به صندوق کارآفرینی امید معرفی و در مرحله تشکیل پرونده تسهیلاتی می باشند.

جلسات ماهیانه به طور منظم برگزار گردیده است و مابقی صندوقها نیز در صندوق کارآفرینی امید در حال تشکیل پرونده تسهیلات می باشند.

همکاران پروژه و تسهیلگران

جدول ۱- اسامی مدیر و کارشناسان طرح

شرکت کارآفرینی زاگرس	مجری طرح
سمیه نوشادی	تسهیلگر ارشد
رضا منصوری راد	تسهیلگر و مدیر محلی شهرستان آبادان
کتایون سپهری	کارشناس مشاور کسب و کار
علیرضا فلکدین	کارشناس مشاور بازاریابی
حدیث ناصریان	کارشناس مشاور پوشاک و صنایع دستی

جدول ۲- اسامی تسهیلگران طرح

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره تماس	مناطق تحت پوشش
۱	رضا منصوری راد	۰۹۳۰۱۱۱۳۵۸۹	۵ روستا
۲	رضا احمدی	۰۹۳۹۹۴۱۱۹۴۴	۱۲ روستا
۳	رسول قییم	۰۹۳۰۹۵۱۱۲۳۸	۸ منطقه شهری
۴	کاظم عامریان	۰۹۳۶۵۶۹۹۳۶۴	۸ روستا
۵	حسین عامری		۷ روستا

جلسات مهم برگزار شده در راستای پروژه

ردیف	عنوان جلسه	نوع جلسه	تاریخ	حاضرین	محل جلسه
۱	هماهنگی ورود به شهرستان	رسمی	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	جلسه با خبرگان محلی و روستایی	مناطق روستایی آبادان
۲	جلسه هماهنگی با ناظر پروژه	رسمی	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	تیم محلی و آقای عساکره	دفتر خیریه آقای عساکره در خرمشهر
۳	جلسه با تسهیلاتگران محلی و بازدید از روستاهای هدف	غیر رسمی	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	مجری پروژه - تیم تسهیلاتگران	آبادان
۴	جلسه با ناظر پروژه	رسمی	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	مدیرعامل موسسه خیریه نعیم - مدیرعامل شرکت کارآفرینی زاگرس - آقای عساکره	دفتر موسسه خیریه نعیم در تهران
۵	جلسه با فرماندار آبادان	رسمی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	مجری محلی و فرماندار شهرستان	فرمانداری
۶	حضور در جلسه شورای اشتغال شهرستان	رسمی	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	مجری محلی و فرماندار و اعضای شورای اشتغال شهرستان	فرمانداری
۷	جلسه با بهزیستی شهرستان	رسمی	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	مدیر پروژه، تیم مجری محلی، ریاست بهزیستی شهرستان، مددکاران اجتماعی و مدیران مراکز مثبت زندگی	اداره بهزیستی آبادان
۸	جلسه با معاونت سرمایه گذاری و اشتغال فرمانداری	رسمی	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	مدیر پروژه، تیم مجری محلی، معاونت اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان	فرمانداری
۹	جلسه با تسهیلاتگران	رسمی	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	مدیر پروژه، تسهیلاتگران آبادان	هتل امیرکبیر آبادان
۱۰	جلسه با مدیر توسعه و خانه خلاق منطقه آزاد الوند	رسمی	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	مدیر پروژه، تیم مجری، معاونت توسعه منطقه آزاد الوند	ساختمان مرکزی منطقه آزاد
۱۱	جلسه با صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان	رسمی	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	مدیر پروژه، معاونت تسهیلات، مدیر شهرستان	صندوق امید استان
۱۲	جلسه با صندوق کارآفرینی امید شهرستان آبادان	رسمی	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	مدیر پروژه، مدیر شهرستان، کارشناسان شهرستانی، تسهیلاتگران	صندوق امید شهرستان
۱۳	جلسه با هاسب	رسمی	مهرماه ۱۴۰۲	مدیرعامل موسسه خیریه نعیم، مدیر پروژه زاگرس، آقای مهندس مقیمی و تیم هاسب	دفتر هاسب
۱۴	جلسه با هاسب	رسمی	۸ آبانماه ۱۴۰۲	مدیرعامل موسسه خیریه نعیم، مدیرعامل زاگرس، آقای مهندس مقیمی و تیم هاسب	دفتر هاسب
۱۵	جلسه با صندوق امید کشور	رسمی	۲۴ آبانماه ۱۴۰۲	معاونت اعتبارات صندوق، مدیرعامل زاگرس و تیم صندوق کارآفرینی امید	دفتر مرکزی صندوق امید کشور
۱۶	جلسه با بنیاد برکت	رسمی	۱۷ دیماه ۱۴۰۲	معاونت سرمایه اجتماعی بنیاد برکت و مدیرعامل زاگرس	دفتر بنیاد برکت در تهران
۱۷	جلسه با صندوق امید	رسمی	۲۱ دیماه ۱۴۰۲	معاونت توسعه کسب و کار و مدیرعامل زاگرس	دفتر صندوق امید در تهران
۱۶	جلسه با بسیج سازندگی	رسمی	۲۳ دیماه ۱۴۰۲	دبیر اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی - مدیرعامل زاگرس، کارشناس صندوق امید	دفتر دکتر فرهی در بسیج سازندگی

روستاهایی که صندوق ها تشکیل شدند

ردیف	مزیت منطقه ای آبادان
۱	روستای شلحه حاج حسین تولیدی پوشاک - فرآوری خرما
۲	روستای ثوامر فرآوری خرما و نخيلات
۳	روستای امام حسن عسکری فرآوری خرما و سرکه
۴	روستای حیر فرآوری خرما و سرکه
۵	روستای نوآباد شيلات
۶	روستای چوبیده فرآوری خرما و سرکه
۷	روستای خضرنبی کاشت الویرا و کشاورزی
۸	روستای سادات فرآوری خرما و سرکه
۹	روستای صیداویه پرورش دام (گاو و گام میش و برغاله)
۱۰	روستای طره بخاع پرورش دام (گاو و گام میش و برغاله)
۱۱	روستای آلبوعبادی فرآوری خرما و سرکه
۱۲	روستای تنگه ۱ محصولات غذایی و بسته بندی
۱۳	روستای تنگه ۲ پرورش دام (گاو و گام میش و برغاله)
۱۴	روستای تنگه ۳ صنایع دستی
۱۵	روستای ابوشانک بیشتر صیفی جات و بامیه محلی
۱۶	روستای آلبوحمید گردشگری
۱۷	روستای خرخره تولیدی پوشاک
۱۸	روستای رستمیه صیفی جات
۱۹	روستای سلیم صیفی جات
۲۰	روستای عفادله فرآوری خرما و سرکه
۲۱	روستای مدن گردشگری روستایی
۲۲	روستای مچری فرآوری خرما و سرکه
۲۳	نهر قصر فرآوری خرما و سرکه
۲۴	روستای طلیب فرآوری خرما و سرکه
۲۵	روستای کت شنوف فرآوری خرما و سرکه
۲۶	روستای ابوشکر فرآوری خرما و سرکه
۲۷	روستای ابوغلان شيلات
۲۸	روستای ابوخرزروی شيلات

ادامه روستاهایی که صندوق ها تشکیل شدند

مزیت منطقه ای آبادان		ردیف
تولیدی پوشاک	روستای ابوفلوس	۲۹
خدمات کامپیوتری	نهر ابطر	۳۰
تولیدی پوشاک و صنایع دستی	روستای عریض	۳۱
تولیدی پوشاک	روستای بچاچره	۳۲
فرآوری خرما	روستای ابو دیره	۳۳
تولیدی پوشاک	روستای سیهان	۳۴
تولیدی پوشاک	روستای دلگه	۳۵
تولیدی پوشاک	روستای طره خضر	۳۶

محلات شناسایی شده و هدف پروژه در شهرستان آبادان

مزیت منطقه ای آبادان		ردیف
تولیدی پوشاک	محله زمین شهری	۱
تولیدی پوشاک	شهرک ۲۰۰۰ واحدی ارونند کنار	۲
فرآوری خرما و سرکه	محله شهرک	۳
فرآوری خرما و سرکه	محله سلیج شرقی	۴
تولیدی پوشاک	محله ذوالفقاری ۳۰ متری	۶
تولیدی پوشاک	محله جمشیدآباد	۷
فرآوری خرما و سرکه	محله کوی کفیشه	۸
تولیدی پوشاک	محله احمد آباد	۹

خلاصه مطالعه ظرفیت ها و مزیت های روستاها و مناطق حاشیه شهری هدف شهرستان آبادان

ردیف	نام صندوق	نام روستا یا محله	موقعیت	نام تسهیلتگر	تعیین ارکان صندوق	تشکیل صندوق	تعداد اعضای صندوق	معرفی برای افتتاح حساب	افتتاح حساب در ص ک امید	تأمین موجودی ۱۰ درصد هر صندوق	نامه پرداخت تسهیلات	تشکیل پرونده تسهیلات	
۱	همتای شلحه حاج حسین	روستای شلحه حاج حسین	روستا	حسین غامری	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓		
۲	همتای توامر	روستای توامر	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۳	همتای امام حسن عسکری	روستای امام حسن عسکری	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۴	همتای خیر	روستای خیر	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۵	همتای نوآباد	روستای نوآباد	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۶	همتای چوپیده	روستای چوپیده	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۷	همتای خضرینی	روستای خضرینی	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۸	همتای سادات	روستای سادات	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۹	همتای صیداویه	روستای صیداویه	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۰	همتای طره بخاغ	روستای طره بخاغ	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۱	همتای ابوعدای	روستای ابوعدای	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۲	همتای تنگه ۱	روستای تنگه ۱	روستا	فلامیرضا درویش نژاد	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓		
۱۳	همتای تنگه ۲	روستای تنگه ۲	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۴	همتای تنگه ۳	روستای تنگه ۳	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۵	همتای ابوشانک	روستای ابوشانک	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۶	همتای نهر ابو فلفل	نهر ابو فلفل	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۷	همتای ابوحمید	روستای ابوحمید	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۸	همتای خرخره	روستای خرخره	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۹	همتای رستمیه	روستای رستمیه	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۲۰	همتای سلیم	روستای سلیم	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۲۱	همتای غفاده	روستای غفاده	روستا		✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۲۲	همتای مدن	روستای مدن	روستا		رسول قیام	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	
۲۳	همتای مجری	روستای مجری	روستا	✓		✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۲۴	همتای قصر	نهر قصر	روستا	✓		✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۲۵	همتای طیب	روستای طیب (طیلب)	روستا	✓		✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۲۶	همتای شوسف	روستای شوسف	روستا	✓		✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۲۷	همتای ابوشوکر	روستای ابوشوکر	روستا	✓		✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۲۸	همتای ابوغزلان	روستای ابوغزلان	روستا	✓		✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۲۹	همتای ابوفلوس	روستای ابوفلوس	روستا	✓		✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۳۰	همتای ابطر	نهر ابطر	روستا	✓		✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۳۱	همتای عریض	روستای عریض	روستا	✓		✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۳۲	همتای بچاچره	روستای بچاچره	روستا	✓		✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	
۳۳	همتای دیره	روستای ابو دیره	روستا	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۳۴	همتای سیهان	روستای سیهان	روستا	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۳۵	همتای دلگه	روستای دلگه	روستا	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۳۶	همتای خضر	روستای طره خضر	روستا	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۳۷	همتای ابوخضراوی	روستای ابوخضراوی	روستا	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۳۸	همتای محله سلج شرقی	محله سلج شرقی	شهری	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۳۹	همتای محله ذوالفقاری ۳۰ متری	محله ذوالفقاری ۳۰ متری	شهری	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۴۰	همتای محله جمشیدآباد	محله جمشیدآباد	شهری	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۴۱	همتای محله کوی کفیشه	محله کوی کفیشه	شهری	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۴۲	محله زمین شهری	محله زمین شهری	شهری	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۴۳	شهرک ۲۰۰۰ واحدی اروند کنار	شهرک ۲۰۰۰ واحدی اروند کنار	شهری	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۴۴	محله شهرک	محله شهرک	شهری	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۴۵	محله احمد آباد	محله احمد آباد	شهری	✓	✓	۱۵	✓	✓	✓	✓	✓		
۳	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۶۷۵	۴۵	۴۵						

پیشرفت پروژه

نوع فعالیت	شرح فعالیت آتی	زمان بندی	وزن عملیاتی	درصد انجام شده تا ۱۴۰۲/۲/۱۹	درصد انجام شده تا ۱۴۰۲/۹/۴	درصد انجام شده تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
تشکیل صندوق	ورود به منطقه ، مطالعه و انتخاب مناطق هدف	سال اول پروژه	۴٪	۴٪	۴٪	۴٪
	شناسایی و انتخاب تسهیلاتگران		۲٪	۲٪	۲٪	
	آموزش تسهیلاتگران		۳٪	۳٪	۳٪	
	شناسایی اعضای صندوق ها (جامعه محلی)		۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	
	تشکیل صندوق ها		۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	
	آموزش ارکان		۵٪	۵٪	۰٪	
	افتتاح حساب صندوق ها در بانک عامل		۴٪	۴٪	۳.۵٪	
	تشکیل جلسات ماهیانه (حداقل ۴ ماه قبل از تسهیلات)		۴٪	۳٪	۳٪	
	پیگیری تامین اعتبار در بانک عامل و ثبت کارا		۵٪	۳٪	۳٪	
	آموزش تربیت مربی کارآفرینی (سه دوره آموزشی)		۳٪	۱٪	۰٪	
	دریافت تسهیلات		آموزش اعضای صندوق ها (سه دوره آموزشی)	سال دوم پروژه	۹٪	۰٪
پرداخت تسهیلات از بانک عامل برای صندوق های خرد		۶٪	۰٪		۰٪	۱٪
ارائه خدمات مشاوره کسب و کار		۵٪	۱٪		۰٪	۲٪
بازدید و مانیتورینگ کسب و کارها		۱۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
آموزش های رشد کسب و کار به ارکان (شامل دوره های بازاریابی-فروش- تجاری سازی - حقوقی و برند سازی		۵٪	۰٪		۰٪	۰٪
توسعه و تکمیل کسب و کارها	طراحی خوشه کسب و کار	سال سوم پروژه	۵٪	۰٪	۰٪	۰٪
	ایجاد برند در منطقه		۵٪	۰٪	۰٪	۰٪
	تسهیل ایجاد زنجیره تامین		۵٪	۰٪	۰٪	۰٪
		جمع	۱۰۰٪	۳۸.۵٪	۴۶٪	۶۱٪

مشکلات و ریسک های دوره گزارش دهی

مشکلات:

- محدودیت های تسهیلاتی صندوق کارآفرینی امید
- تامین هزینه های پروژه

ریسک ها:

- ریسک خاصی مشاهده نشده است.

میزان پیشرفت پروژه

درصد پیشرفت پروژه		نام فاز	ردیف
انجام شده	باید انجام می شد		
۶۱٪	۶۰٪	کل عملیاتی اجرایی پروژه	۱

جدول تاخیرات کلیدی پروژه

ردیف	عنوان تاخیر	علت تاخیر	پیامدهای ناشی از تاخیر
۱	-		

تغییرات کلی پروژه

-	تاریخ تایید اعمال تغییر	-	عنوان تغییر
-	سمت در پروژه	-	مبدا درخواست تغییر
-			شرح تغییر
-			دلایل ایجاد تغییر
-			تاثیر تغییر بر محدوده پروژه
-			تاثیر تغییر بر هزینه‌های پروژه
-			تاثیر تغییر بر زمانبندی پروژه


گزارش تصویری پروژه - بازدیدها





جلسه مدیر محلی پروژه با آقای عساکره در دفتر خرمشهر



بازدید مدیرعامل شرکت کارآفرینی از روستاهای هدف در آبادان

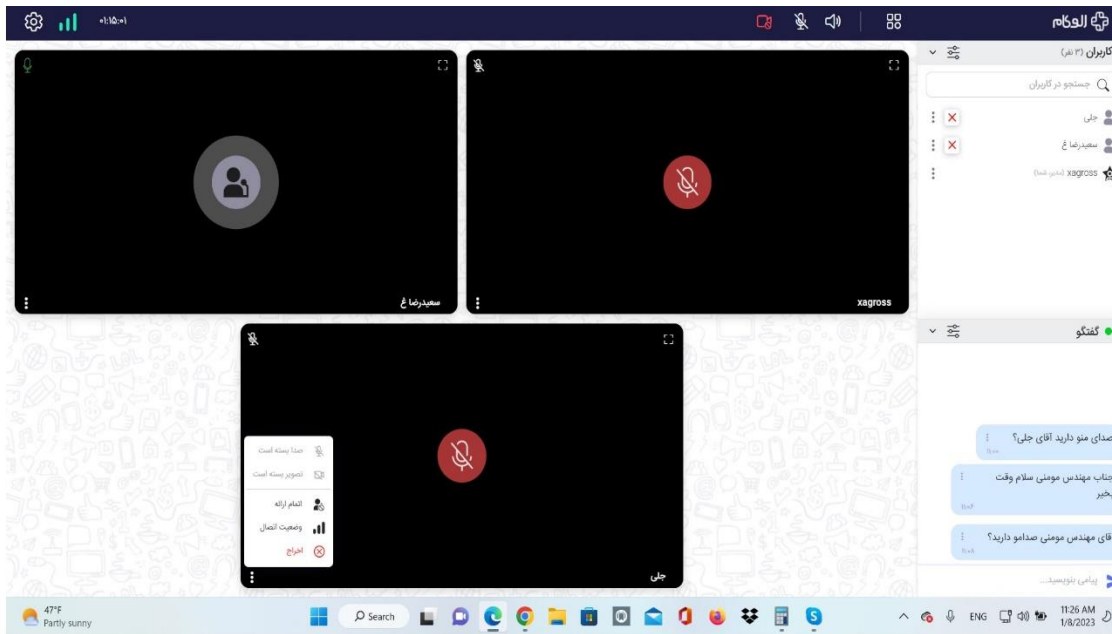

جلسه آنلاین آشنایی آقای مهندس مومنی با تیم محلی آبادان

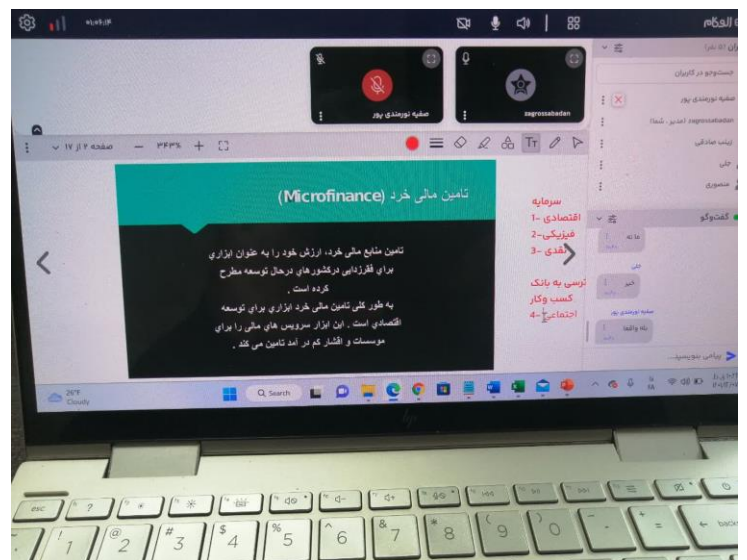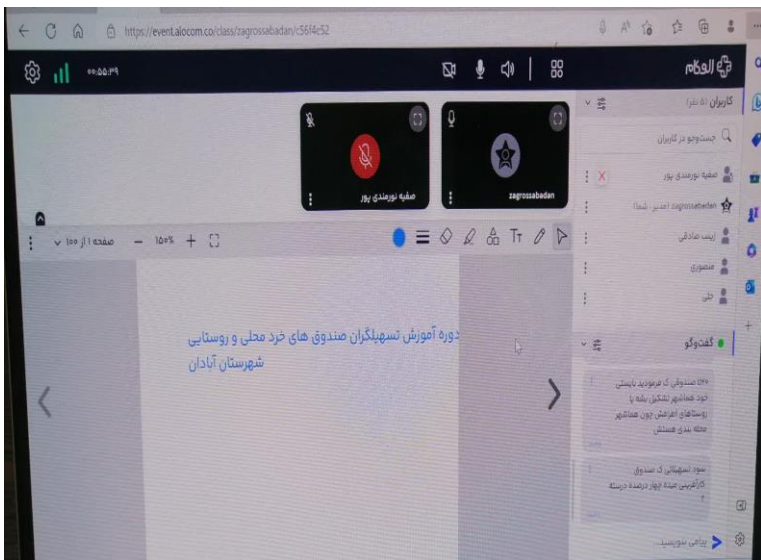

دوره آنلاین آموزش تسهیلاترگان آبادان

جلسات با نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان آبادان



جلسه با معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان و اعضای کارگروه اشتغال شهرستان در خصوص تبیین اهداف و برنامه های پروژه



جلسه با معاون اشتغال فرمانداری شهرستان در خصوص بررسی روستاها و ظرفیت های اشتغال در آبادان



جلسه با کارشناس مسئول واحد توسعه و خانه خلاق منطقه آزاد الوند در خصوص جلب همکاری در تامین فضای فروش و همکاری های مشترک در بخش حمایتی

جلسه با مددکاران، مدیران مراکز حمایتی و مثبت زندگی و کارشناسان و رئیس بهزیستی شهرستان آبادان در خصوص معرفی برنامه و جذب حداکثری جامعه هدف بهزیستی

جلسات معرفی طرح در جوامع روستایی و حاشیه شهری و تشکیل صندوق ها





تصاویر بازدید از کارگاههای موجود در مناطق روستاهای هدف



تصاویر برگزاری دوره آموزش ارکان صندوق ها (دوره های حسابداری و مدیریت صندوق)



تصاویر برگزاری دوره آموزش ارکان صندوق ها (دوره های حسابداری و مدیریت صندوق)



تصاویر دوره تربیت مربی کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار - آذرماه ۱۴۰۲





دوره سوم تربیت مربی کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار



آموزش مهارت‌های کسب و کار در روستاها و مناطق شهری آبادان توسط مربیان آموزش دیده



جلسات ماهیانه صندوق ها

